



VALTERRA
EAU - ÉTUDES - CONSEIL

**DEPARTEMENT DES VOSGES (88)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE RAMBERVILLERS**



**ETUDE DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT
- COMMUNE DE CLEZENTAIN -**

RAPPORT DE PHASE 2

**ETUDE COMPARATIVE TECHNICO-FINANCIERE DES SOLUTIONS
D'ASSAINISSEMENT**

DECEMBRE 2025

DEPARTEMENT DES VOSGES (88)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE RAMBERVILLERS

ETUDE DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT
- COMMUNE DE CLEZENTAINES -

Etude réalisée par :

	VALTERRA Eau Etudes Conseil	 VALTERRA EAU - ÉTUDES - CONSEIL
Adresse	2 b, Promenade de la Pierre d'Appel - BP 24 - 88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE	
Téléphone	03 29 58 99 81	
Fax	03 29 58 99 82	
Email	contactv2ec@valterra.fr	

Coordonnateur du Groupement de Commandes	COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE RAMBERVILLERS 59B, avenue du 11 novembre 88700 RAMBERVILLERS	 Communité de communes 
Maître d'Ouvrage	COMMUNE DE CLEZENTAINES 68, Rue de la Grande-Fontaine 88700 CLEZENTAINES	
AMO	Conseil Départemental des Vosges - SATESE 8 rue de la Préfecture 88088 EPINAL cedex 9	 LA VIE EN VOSGES le Département
Partenaires	Agence de l'eau Rhin-Meuse "Le Longeau" - Route de Lessy – ROZERIEULLES 57161 MOULINS LES METZ CEDEX	 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité  AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE
Intervenant	SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (88) 9, Avenue Pierre Blanck 88000 ÉPINAL	

Rapport de Phase 2	
Document rédigé par :	Marina RECKLING
N° d'affaire :	V2EC 579
Date du dossier :	Décembre 2025
Indice de révision :	V2

SOMMAIRE

PREAMBULE.....	1
OBJECTIFS DE L'ETUDE	2
I - RAPPEL DES ETAPES PRECEDENTES (PHASE 1)	4
1. Réunions de démarrage	4
2. Recueil des données.....	4
3. Analyse de l'état initial du territoire	4
4. Analyse des perspectives d'évolution	5
5. Réunion de présentation de la phase 1	5
6. Objectifs finaux.....	5
II - SYNTHESE DES DONNEES DE LA PHASE 1	6
1. Présentation de la commune	6
2. Analyse des enjeux et contraintes identifiés	7
2.1 Contraintes réglementaires, environnementales et socio-économiques.....	7
2.2 Analyse de l'évolution démographique, urbanistique et des activités communales pour l'évaluation des charges à traiter	8
2.1 Résultats des investigations de phase 1	9
III - METHODOLOGIE D'ETUDE ET D'EVALUATION DES SCENARIOS D'ASSAINISSEMENT	10
1. Prescription des solutions d'assainissement.....	11
1.1 Ouvrages d'assainissement non collectif	11
1.2 Caractéristiques principales des ouvrages d'assainissement collectif	12
2. Prix unitaires utilisés pour les coûts d'investissement	16
2.1 Assainissement non-collectif	16
2.2 Assainissement collectif	19
3. Prix unitaires pour les charges d'exploitation.....	21
3.1 Assainissement non-collectif	21
3.2 Assainissement collectif	24
IV - ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE DES SCENARIOS D'ASSAINISSEMENT	27
1. Scénario 1.....	27
1.1 Assainissement Non Collectif	27
1.2 Assainissement collectif	28
1.3 Synthèse.....	29
2. Scénario 2	30
2.1 Assainissement Non Collectif	30
2.2 Assainissement collectif	32
2.3 Synthèse.....	34
3. Comparatif des scénarios d'assainissement	35
4. Comparatif avec les solutions étudiées précédemment	37
5. Mode de gestion et subventions des systèmes d'assainissement	38
5.1 Assainissement non collectif	38
5.2 Assainissement collectif	40
6. Simulation financière 1 - Subvention à 0%	42
7. Simulation financière 2 - Subvention à 70%.....	45
POURSUITE DE L'ETUDE ET ORIENTATIONS DE LA PHASE 3	48

FIGURES

Figure 1 : Délimitation de la commune sur une carte IGN (source : SIGES Rhin-Meuse)	6
Figure 2 : Vue en coupe d'une STEU de type « filtre planté de roseaux à deux étages » (Source : Les procédés d'épuration des petites collectivités Agence de l'Eau Rhin Meuse).....	12
Figure 3 : Vue en plan d'une STEU type « filtre planté de roseaux à deux étages » (Source : Les procédés d'épuration des petites collectivités Agence de l'Eau Rhin Meuse)	13
Figure 4 : Système de collecte pour l'assainissement collectif (source : CC Haut Val de Sèvre)	16
Figure 5 : Evolution du coût d'une STEU en fonction de sa capacité de traitement exprimée en EH ..	20
Figure 6 : Immeubles concernés par le zonage ANC dans le scénario 2	31
Figure 7 : Comparatif des coûts liés aux scénarios d'assainissement	36
Figure 8 : Proposition du prix de l'assainissement (€/m ³) – simulation à 0% d'aides.....	43
Figure 9 : Simulation financière 1 – simulation à 0% d'aides.....	44
Figure 10 : Proposition du prix de l'assainissement en €/m ³ – simulation à 70% d'aides	46
Figure 11 : Simulation financière 2 - simulation à 70% d'aides.....	47

TABLEAUX

Tableau 1 : Caractéristiques urbaines et démographiques de la commune.....	9
Tableau 2 : Charges en EH des activités existantes.....	9
Tableau 3 : Coûts unitaires par filière ANC	17
Tableau 4 : Classification des conformités réglementaires (SDANC 88) et taux de travaux concerné .	18
Tableau 5 : Coûts unitaires pour les travaux d'assainissement collectif.....	19
Tableau 6 : Synthèse des coûts de fonctionnement des dispositifs ANC.....	23
Tableau 7 : Coûts de fonctionnement annuels des postes de relevage (ou de refoulement)	24
Tableau 8 : Coût de fonctionnement des STEU selon leurs équipements et capacités	25
Tableau 9 : Synthèse des coûts de fonctionnement des STEU	26
Tableau 10 : Etat de conformité de l'ANC (source : résultats des contrôles du SDANC 88)	27
Tableau 11 : Répartition des filières ANC à mettre en œuvre	27
Tableau 12 : Chiffrage du Scénario 1 - mise en conformité des dispositifs ANC	28
Tableau 13 : Synthèse des coûts du scénario 1.....	29
Tableau 14 : Liste des propriétés maintenues en Assainissement Non Collectif (ANC) – Scénario 2...	30
Tableau 15 : Répartition des filières ANC à mettre en œuvre	30
Tableau 16 : Chiffrage du Scénario 2 - mise en conformité des dispositifs ANC	31
Tableau 17 : Coûts relatifs à l'assainissement collectif – Scénario 2	33
Tableau 18 : Synthèse des coûts du scénario 2.....	34
Tableau 19 : Comparatif des coûts d'investissement et d'exploitation des différents scénarios.....	35
Tableau 20 : Potentielles aides de l'AERM pour la mise en conformité de l'ANC.....	39
Tableau 21 : Nombre d'abonnés à l'assainissement collectif et volume potentiellement facturable .	42
Tableau 22 : Coût annuel de l'assainissement collectif – simulation à 0% d'aides.....	42
Tableau 23 : Redevance d'assainissement proposée pour l'assainissement collectif	43
Tableau 24 : Coût annuel de l'assainissement collectif – simulation à 70% d'aides.....	45
Tableau 25 : Redevance d'assainissement proposée pour l'assainissement collectif	46

ANNEXES

Annexe 1 : Synthèse de l'assainissement existant et projection du scénario 1
Annexe 2 : Plan du scénario d'assainissement collectif

PREAMBULE

En France, le paysage rural est marqué par une dispersion de l'habitat, avec des bourgs regroupés autour de bâtiments centraux et des logements épars ou en hameaux. Cette configuration rend le choix du système d'assainissement complexe, tant sur le plan technique qu'économique. Les systèmes d'assainissement non collectif (ANC) traditionnels sont souvent inadaptés, tandis que les systèmes collectifs sont limités par leurs coûts élevés.

Depuis l'arrêté du 7 Novembre 2009, des solutions techniques compactes et innovantes pour l'assainissement non collectif (ANC) sont accessibles, sous réserve de l'obtention d'agréments officiels¹. Le choix d'une solution doit tenir compte des contraintes spécifiques de la propriété, de l'état des infrastructures existantes, des habitudes croissantes de consommation d'eau, ainsi que de l'augmentation des rejets d'eaux usées.

Le zonage d'assainissement est un document établi pour délimiter les zones d'assainissement des eaux usées au niveau communal. Ce document définit les orientations à suivre pour la mise en place et la gestion des systèmes d'assainissement, qu'ils soient collectifs ou non collectifs.

Pour la commune de CLEZENTAIN, l'objectif est de répondre aux besoins actuels et futurs en matière d'assainissement, tout en garantissant une gestion harmonieuse des ressources naturelles et un respect des normes environnementales et sanitaires.

La présente phase 2 poursuit l'analyse des données collectées et l'identification des solutions techniques et financières adaptées au territoire de la commune, en tenant compte des contraintes urbanistiques, économiques et sociales. Ce présent rapport s'inscrit alors dans le cadre de l'élaboration de la phase 2 du zonage d'assainissement. L'objectif est de déterminer les meilleures solutions pour la gestion des eaux usées, en conformité avec la réglementation en vigueur, tout en assurant une viabilité économique à long terme pour la commune et ses habitants. Par ailleurs, les zones d'assainissement ainsi que leur type seront définies.

¹ Portail interministériel sur l'assainissement non collectif (ANC) :

assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

Dispositifs d'assainissement non collectif (ANC) agréés :

<https://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/agrement-des-dispositifs-de-traitement-r92.html>

OBJECTIFS DE L'ETUDE

Conformément à l'article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), une étude de zonage d'assainissement a été réalisée entre 2000 et 2008. L'étude a conduit à proposer le zonage d'assainissement collectif sur l'ensemble de la commune de CLEZENTAIN (hormis les écarts). Par ailleurs, compte tenu du coût élevé de la construction d'un système d'assainissement collectif pour une commune rurale, les capacités financières de cette dernière ne permettaient pas la réalisation du système qui devait être mis en œuvre suite au zonage d'assainissement initial.

Aujourd'hui, en l'absence de système d'assainissement collectif, les eaux usées produites par les immeubles devraient donc être traitées individuellement au niveau de chaque immeuble, avec toutefois des degrés d'épuration divers suivant l'âge des constructions et le type de filières mises en place à l'origine. Il est ainsi probable qu'une partie des effluents soient rejetés aujourd'hui vers le milieu naturel sans aucun traitement préalable, si ce n'est d'anciennes fosses septiques individuelles.

Face aux évolutions technologiques et aux nouvelles contraintes réglementaires et environnementales, la commune a décidé de mettre à jour son schéma directeur et zonage d'assainissement. Cette mise à jour est d'autant plus pertinente qu'elle intervient après la publication de l'arrêté du 7 Novembre 2009, fixant les prescriptions techniques des systèmes d'assainissement non collectif. Cet arrêté a permis l'émergence de technologies d'assainissement compactes, de faible encombrement, sous réserve qu'elles soient agréées par les Ministères de l'Écologie et de la Santé. Ces nouvelles technologies pourraient, dans certains cas, rendre l'assainissement individuel viable, là où il avait été jugé difficile voire impossible lors des études précédentes.

Ce changement de perspective ouvre de nouvelles possibilités pour les habitations qui, dans le passé, avaient été incluses dans le zonage d'assainissement collectif.

Au regard du coût élevé de l'assainissement collectif, particulièrement dans les zones rurales, et des nouvelles aides financières disponibles de l'Agence de l'Eau, il devient nécessaire pour la commune d'obtenir des informations plus précises sur les solutions envisageables. Cette étude vise donc à offrir aux élus les éléments techniques et financiers nécessaires pour choisir les solutions d'assainissement les plus adaptées à la gestion des eaux usées domestiques.

Les objectifs principaux de cette étude sont les suivants :

- Garantir aux habitants actuels et futurs des solutions durables pour l'évacuation et le traitement des eaux usées ;
- Respecter l'environnement en préservant les ressources en eaux souterraines et superficielles ;
- Trouver le meilleur compromis économique pour les collectivités ;
- Se conformer à la législation en vigueur.

L'étude se déroulera en trois phases :

- **Phase 1** : Etat des lieux et analyse de l'existant ;
- **Phase 2 : Étude comparative technico-financière des solutions d'assainissement ;**
- **Phase 3** : Modification du zonage d'assainissement et enquête publique.

Cette seconde phase s'appuie sur les éléments recueillis lors de la phase 1, qui a permis d'analyser les enjeux et contraintes du territoire. Elle se concentre sur l'évaluation des différents scénarios d'assainissement, en tenant compte des aspects techniques, financiers, environnementaux et sociaux.

Le choix des solutions retenues sera justifié à travers une analyse détaillée des coûts d'investissement et de fonctionnement, ainsi que des impacts potentiels sur les habitants et sur l'organisation communale.

La méthodologie adoptée pour cette étude repose sur une approche rigoureuse et détaillée, avec un focus particulier sur les hypothèses spécifiques relatives à l'assainissement non collectif et collectif. Chaque scénario sera évalué en fonction de sa faisabilité technique, de son coût estimé, et des impacts sur le prix de l'assainissement.

En outre, des options de financement seront explorées afin de permettre une mise en œuvre réaliste et équilibrée des solutions d'assainissement.

I - RAPPEL DES ETAPES PRECEDENTES (PHASE 1)

1. Réunions de démarrage

En présence du comité de pilotage, le démarrage de l'étude s'est effectué via une réunion de présentation de la démarche à suivre pour la réalisation de zonages d'assainissement et pour clarifier les attentes, les scénarios à étudier et valider le planning.

2. Recueil des données

Plusieurs étapes ont marqué la phase 1 :

- **Réunion en Mairie** : Le démarrage de la mission a été également marqué par une réunion au niveau de la commune concernée par le zonage d'assainissement, dans un souhait de recueil de données, d'informations et l'identifications de diverses contraintes.
- **Consultation documentaire** : données (plans, diagnostics, rapports, etc.) auprès d'organismes et du maître d'ouvrage (Mairie, SDANC88, AERM, BRGM, IGN, Cadastre, etc.).
- **Visites de terrain** : Inspection in-situ pour analyser les infrastructures (habitat), et l'établissement des scénarios d'assainissement collectif.
- **Levé des réseaux** : Etat des lieux et levé du réseau d'eaux pluviales (exutoires, profondeurs des réseaux, type d'ouvrage, etc.) ;
- **Compilation d'informations clés** : Consommations d'eau potable, projets d'urbanisation, événements hydrauliques ou géologiques, et activités humaines et locales, etc...

3. Analyse de l'état initial du territoire

La première phase de l'étude a consisté en un état des lieux approfondi des infrastructures d'assainissement de la commune de CLEZENTAIN. Cette étape a impliqué la collecte et l'analyse de données relatives à l'occupation du sol, à l'hydrologie locale, à la topographie, ainsi qu'à l'urbanisation existante et projetée. Les principales contraintes identifiées incluent la faisabilité technique des systèmes d'assainissement en raison de la topographie variée, ainsi que les exigences réglementaires en matière de protection de l'environnement et des ressources en eau.

Un inventaire des infrastructures existantes a également été réalisé, permettant d'identifier les secteurs de la commune ne disposant pas d'un système d'assainissement non collectif adapté, ainsi que de préparer la construction d'un projet SIG répertoriant les réseaux d'eaux pluviales de la commune. Ces données serviront de base pour la réflexion et la proposition de scénarios d'assainissement lors de la phase 2, ainsi que pour l'élaboration d'une base de données dans le cadre de la gestion patrimoniale des ouvrages, qu'ils soient publics (réseaux d'eaux pluviales) ou privés (systèmes d'assainissement non collectif des particuliers).

Les thématiques suivantes ont été notamment abordées :

- ✓ **Milieu physique et naturel** : Identification des zones sensibles (captages, cours d'eau, zones humides, etc.) et des caractéristiques environnementales du territoire.
- ✓ **Habitat et contraintes topographiques** : Analyse des contraintes liées à l'habitat (pente, taille des parcelles, localisation, etc.) pour adapter les filières d'ANC et / ou l'élaboration d'un scénario d'assainissement collectif.
- ✓ **Consommations d'eau potable** : Analyse des usages sur la période 2021 à 2024, en tenant compte des captages et périmètres de protection associés.
- ✓ **Analyse de l'existant en termes d'ANC** : Synthèse des contrôles réglementaires existants du SDANC 88.
- ✓ **Levé de réseau et cartographie** : Construction d'une base de données ayant permis l'élaboration de plans des réseaux et le référencement de leurs exutoires.
- ✓ **Analyse de l'existant en termes de gestion des eaux pluviales** : analyse des pratiques et présentation de fiches thématiques « GEPU » en annexe du rapport de phase 1.

4. Analyse des perspectives d'évolution

Intégration des projets d'urbanisme et les perspectives de développement à court et long termes pour anticiper les besoins futurs. Cette approche repose notamment sur la prise en compte des immeubles à réhabiliter.

5. Réunion de présentation de la phase 1

Organisation d'une réunion pour valider les données collectées et proposer des projets de scénarios de mise en conformité de l'assainissement à étudier.

6. Objectifs finaux

Validation des données et des scénarios d'assainissement proposés afin d'identifier les schémas d'assainissement viables sur des critères techniques et environnementaux, soit la préparation de la phase 3 permettant la mise à jour du zonage d'assainissement.

II - SYNTHÈSE DES DONNÉES DE LA PHASE 1

1. Présentation de la commune

CLEZENTAIN est une petite commune rurale des Vosges située à environ 12 km au Nord-Ouest de RAMBERVILLERS, siège de la 2C2R et en limite du département de Meurthe-et-Moselle (54).

Les communes limitrophes de CLEZENTAIN sont les suivantes :

- GIRIVILLER (54) au Nord-Ouest ;
- MATTEKEY (54) au Nord ;
- MAGNIÈRES (54) au Nord-Est ;
- DEINVILLERS à l'Est ;
- HAILLAINVILLE à l'Ouest ;
- FAUCONCOURT au Sud ;
- HARDANCOURT au Sud-Est ;
- SAINT-MAURICE-SUR-MORTAGNE au Nord-Est.

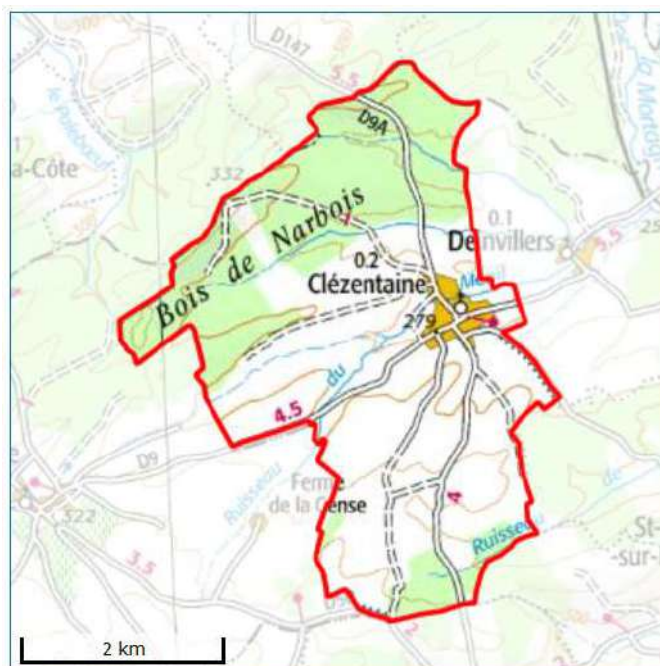


Figure 1 : Délimitation de la commune sur une carte IGN (source : SIGES Rhin-Meuse)

L'aire d'étude, à dominante rurale, s'étend sur une superficie d'environ 1 300 hectares et elle est située à une altitude variable comprise entre 265 m NGF à l'aval du ruisseau du Méné, en limite de la commune de DEINVILLERS à l'Est et 351 m NGF au niveau des sommets de forêts « Bois de Narbois » au Nord-Ouest et la forêt de RAMBERVILLERS au Sud-Ouest.

Le territoire de la commune de CLEZENTAIN est caractérisé par une prédominance d'activités agricoles (60%) et de zones forestières (37%), tandis que les espaces urbanisés (habitat et infrastructures) sont marginaux.

L'habitat est principalement constitué de groupes d'immeubles mitoyens en bordures de la « Rue de la Grande Fontaine » et la « Grande Rue », avec une habitation largement à l'écart au Nord de la commune.

2. Analyse des enjeux et contraintes identifiés

2.1 Contraintes réglementaires, environnementales et socio-économiques.

Les enjeux liés à l'assainissement, qu'il s'agisse d'assainissement collectif ou non collectif (ANC), sont désormais encadrés par un corpus réglementaire renforcé à l'échelle européenne et nationale. Ils visent à garantir la protection de la santé publique, la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques, ainsi que le respect des obligations environnementales et climatiques.

Cadre réglementaire européen

La nouvelle **directive (UE) 2024/3019² relative au traitement des eaux urbaines résiduaires**, adoptée en avril 2024, remplace la directive 91/271/CEE. Elle introduit des exigences renforcées pour les États membres, notamment :

- **Abaissement du seuil de traitement obligatoire à 1 000 EH** (contre 2 000 EH précédemment) pour les agglomérations raccordées ;
- **Généralisation du traitement secondaire** et, pour les zones sensibles, du traitement tertiaire (azote, phosphore) ;
- **Introduction progressive du traitement des micropolluants**, financé selon le principe du **pollueur-payeur**, notamment par les industriels du secteur pharmaceutique et cosmétique ;
- **Objectif de neutralité énergétique à horizon 2045** pour les systèmes d'assainissement ;
- **Renforcement de la gestion des eaux pluviales**, avec obligation d'élaborer des plans locaux de gestion intégrée des eaux de ruissellement (GIER) dans les zones urbaines.

Cadre réglementaire national

En France, ces obligations sont intégrées dans plusieurs codes :

- Le **Code de l'environnement** (articles L.211-1 et suivants) pose les principes de gestion équilibrée de l'eau, de prévention des pollutions et de préservation des milieux aquatiques ;
- Le **Code de la santé publique** (articles L.1331-1 et suivants) fixe l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement en zone collective dans un délai de deux ans après sa mise en service ;
- Le **Code général des collectivités territoriales** (art.L.2224-10) impose aux communes l'établissement d'un **zonage d'assainissement**, précisant les secteurs relevant du collectif et du non collectif, et doit être approuvé par délibération après enquête publique ;
- La **loi sur l'eau du 3 janvier 1992** et les **arrêtés du 7 mars 2012** encadrent les modalités techniques et de contrôle des dispositifs d'**assainissement non collectif**. Le SPANC est chargé de vérifier la conformité, l'entretien et le fonctionnement de ces systèmes.

² La **Directive du Parlement européen et du Conseil 2024/3019, adoptée le 27 novembre 2024, en remplacement à la DERU 1991**, établit des règles relatives à la collecte, au traitement et au rejet des eaux résiduaires urbaines. Elle introduit des traitements progressifs, allant du secondaire au quaternaire, pour éliminer les micropolluants et réduire les émissions de gaz à effet de serre, visant la neutralité énergétique des stations d'épuration d'ici 2045. Elle établit également des règles relatives à l'accès aux sanitaires pour tous, à la transparence du secteur des eaux résiduaires urbaines, à la surveillance régulière des paramètres pertinents des eaux résiduaires urbaines pour la santé publique et à la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur.

3. Obligations pour les collectivités

Les autorités compétentes en matière d'assainissement sont responsables de :

- **Mettre à jour leur zonage d'assainissement**, en cohérence avec les réalités urbanistiques, environnementales et les nouvelles exigences de la DERU 2024 ;
- **Élaborer ou réviser leur schéma directeur d'assainissement**, incluant désormais :
 - une stratégie de traitement conforme à la DERU 2024 (micropolluants, résilience, performance énergétique),
 - un programme d'investissement adapté,
 - une évaluation des risques sanitaires et environnementaux,
 - des actions en faveur de la gestion durable des eaux pluviales ;
- **Assurer la conformité des réseaux et des stations de traitement**, notamment par :
 - le contrôle de raccordement des usagers,
 - la réduction des eaux parasites,
 - la planification de travaux pour atteindre les niveaux de traitement imposés ;
- **Mettre en œuvre un suivi régulier de la performance** des ouvrages et la transparence vis-à-vis des usagers (indicateurs publics, bilans de fonctionnement, campagnes de communication).

CLEZENTAIN étant une petite commune rurale, la charge de pollution d'eaux usées domestiques et assimilée-domestique est largement inférieure à 1 000 Equivalents-habitants. Ainsi, elle est soumise à moins de contraintes réglementaires, notamment celles fixées par la nouvelle DERU 2024.

2.2 Analyse de l'évolution démographique, urbanistique et des activités communales pour l'évaluation des charges à traiter

L'analyse de l'évolution de l'urbanisme et de la population vise à anticiper les besoins en infrastructures d'assainissement selon des dynamiques démographiques et des projets d'aménagement.

Cette étude s'appuie sur les données démographiques historiques et prospectives, notamment celles de l'INSEE et des informations données par la commune de CLEZENTAIN, ainsi que sur les orientations stratégiques de développement communal. Ces perspectives ont été prises en compte, dans la mesure du possible, en intégrant les connaissances locales des communes, notamment en matière de prévisions urbanistiques.

Ces données permettent d'évaluer les charges de pollutions actuelles et futures à traiter, en tenant compte des variations saisonnières et des spécificités locales, afin d'ajuster au mieux les capacités des infrastructures d'assainissement (station de traitement et poste de refoulement) et de garantir leur durabilité.

Tableau 1 : Caractéristiques urbaines et démographiques de la commune

Nombre d'immeubles occupés		Démographie		Taux d'occupation des logements (INSEE, 2045)
Actuel	Futur	Actuelle	Future	
108	108	228	252	2,43

Outre les activités agricoles, la commune abrite un centre d'incendie et de secours (7 personnes), un gîte de location touristique (5 personnes), une Mairie (2 personnes) ainsi qu'une salle polyvalente avec cuisine d'une capacité de 80 places. La charge relative à ces activités est exprimée ci-dessous en EH :

Tableau 2 : Charges en EH des activités existantes

Etablissement	Capacité	Charges en EH
Centre SDIS	7 personnes	4 EH
Gîte	4 personnes	4 EH
Mairie	2 personnes	2 EH
Salle polyvalente	80 places	16 EH

Les bâtiments recensés ont été intégrés à l'analyse du bâti habité ou ERP (Etablissements Recevant du Public), mais leur ratio d'Équivalents-Habitants (EH) diffère des immeubles résidentiels classiques. En conséquence, la commune doit prendre en compte environ 26 EH supplémentaires liés aux activités existantes sur le territoire. Cette charge complémentaire sera intégrée lors du dimensionnement futur de la station de traitement des eaux usées (STEU) ou des dispositifs ANC.

Suivant les données précédentes, le **nombre d'équivalents-habitants (EH) à prendre en charge pour l'assainissement d'ici 2045 sur l'ensemble du territoire communal est estimé à environ 270 EH (y compris la salle polyvalente et les activités existantes).**

La station de traitement des eaux usées sera dimensionnée sur la base des immeubles inclus dans la zone d'assainissement collectif.

2.1 Résultats des investigations de phase 1

Les **contraintes liées à l'habitat** sont présentées en **annexe 1**. La carte présente à la fois le **Coefficient Spécifique de Difficulté (C.S.D)³** de chaque immeuble ainsi que l'état de conformité de l'ANC connue au **dernier contrôle réglementaire (janvier 2025)**.

De plus, sur le même plan, nous avons également préconisé une **filière d'ANC adaptée en fonction des caractéristiques de chaque immeuble / parcelle**. En cas d'existence d'un contrôle réglementaire, nous prenons en compte ce dernier afin d'affecter le système le plus adapté dans les estimations financières ci-après.

Pour les immeubles non visités par le SDANC 88, l'examen visuel de l'habitat a permis de déterminer le type de filière le plus adapté à la parcelle, en privilégiant la **mise en place d'une filière traditionnelle qui est le système le moins coûteux en investissement et en fonctionnement**.

³ C.S.D : se référer au rapport de phase 1 qui présente la méthodologie d'attribution des C.S.D. pour chaque immeuble, en fonction de plusieurs paramètres (aménagements existants ; topographie, surface, etc.).

III - METHODOLOGIE D'ETUDE ET D'EVALUATION DES SCENARIOS D'ASSAINISSEMENT

Les investigations de terrain réalisées, les résultats associés ainsi que les précédentes conclusions de cette étude permettent de proposer plusieurs scénarios d'assainissement. Il s'agit alors de mettre en relation les éléments d'analyse liés aux contraintes de l'habitat, aux équipements d'assainissement existants et au milieu physique et naturel, déterminés sur chaque secteur urbanisé de la commune.

En croisant ces éléments d'analyse, les scénarios proposés visent à offrir des solutions d'assainissement durables, efficaces et respectueuses de l'environnement, tout en répondant aux besoins spécifiques de chaque secteur urbanisé de la commune.

Conformément au cahier des charges relatif à la présente étude, plusieurs scénarios d'assainissement, collectif et non collectif, seront étudiés en fonction principalement de la configuration de l'habitat et de la topographie du bourg.

I. Scénario 1 :

Conservation d'un mode d'assainissement non collectif pour l'ensemble des habitations de la commune, avec des solutions adaptées à chaque situation. Les installations existantes seront réhabilitées selon les normes techniques actuelles, en tenant compte des spécificités de chaque secteur. En effet, les solutions tiendront compte à la fois de l'état de l'assainissement existant ainsi que du C.S.D appliqué pour chaque immeuble.

L'évaluation technico-économique du scénario 1 se fait principalement au moyen des informations résumées en **annexe 1**, à savoir l'état de conformité des installations ANC et leur coefficient spécifique de difficulté (CSD) pour la réalisation des travaux.

II. Scénario 2 :

Mise en place d'un système d'assainissement collectif, selon l'étendue validée par le comité de pilotage à l'issue de la phase 1. Ce scénario pourra desservir la partie la plus dense du village, avec la création d'un réseau d'Eaux Usées (EU) et d'une Station de Traitement des Eaux Usées (STEU), tout en maintenant certaines zones plus excentrées et les écarts, en assainissement non collectif.

Le plan du scénario 2 relatif à l'assainissement collectif est présenté dans **l'annexe 2**.

III. Scénario variante (non concerné par CLEZENTAIN) :

Pour certaines communes, un scénario variant pourrait être étudié à la demande du maître d'ouvrage, ou en fonction de la configuration et des contraintes existantes à l'échelle du territoire d'étude.

1. Prescription des solutions d'assainissement

1.1 Ouvrages d'assainissement non collectif

Il existe un panel de choix de systèmes d'ANC, adaptés aux caractéristiques des terrains et aux besoins des usagers. Parmi les solutions les plus répandues, on trouve les trois suivants :

Filière traditionnelle (F.T) : comprend un dispositif type fosse toutes eaux (FTE), généralement associée à un système d'épandage ou un filtre à sable. Ce système repose sur des principes de dégradation biologique des polluants, avec un prétraitement dans la FTE où les solides se déposent. L'effluent prétraité est ensuite acheminé vers un dispositif d'épandage dans le sol (tranchées d'épandage, lits filtrants ou filtres à sable) où il subit un traitement supplémentaire par filtration et absorption par le sol ou évacuation vers un exutoire (fossé, réseau pluvial, ...). Bien qu'efficace dans des terrains adaptés, ce système peut présenter des risques pour l'environnement si mal entretenu ou installé dans des conditions inappropriées. Par ailleurs, une bonne connaissance du contexte local (topographie, contexte pédologique de la parcelle, etc.) est indispensable pour la mise en place de ce système.

Filtre compact (F.C) : Solution récente et performante pour le traitement des EU domestiques. Il est composé d'un réacteur dans lequel les eaux usées passent à travers un support filtrant (souvent constitué de matériaux type « filtres synthétiques : pouzzolane, fibre de coco, etc. ») qui favorise la dégradation biologique des polluants.

Le filtre compact peut être utilisé dans des zones résidentielles denses ou des terrains où l'installation d'un système d'assainissement traditionnel est compliquée. Ce système est apprécié pour sa faible empreinte au sol, son efficacité tout en étant peu gourmand en maintenance. **Il nécessite toutefois un entretien régulier afin de garantir son bon fonctionnement dans le temps.**

Micro-station (MS) : système de traitement compact qui utilise des technologies biologiques et parfois physiques pour traiter les EU domestiques. Elle fonctionne généralement par un processus de traitement aéré, où l'eau est passée dans une cuve contenant des bactéries qui dégradent les polluants organiques. Il existe des variantes avec plusieurs chambres pour séparer les différentes étapes de traitement (aération, clarification, filtration). Ce type de système est adapté aux habitations qui présentent des contraintes de surfaces (installation même à l'intérieur d'un garage), tout en étant particulièrement efficace pour une gestion fine de la qualité de l'effluent rejeté. Une microstation permet de réaliser un traitement optimal des eaux usées domestiques, mais **nécessite un entretien régulier et rigoureux**, notamment la vidange et le contrôle des installations. C'est pourquoi elle présente un coût de fonctionnement plus élevé en raison de son système de fonctionnement électrique et pour la maintenance de ses diverses composantes.

1.2 Caractéristiques principales des ouvrages d'assainissement collectif

a) Station de traitement des eaux usées (STEU)

Dans l'hypothèse de la mise en place d'un système d'assainissement collectif, le dimensionnement sera basé sur les calculs réalisés en phase 1, soit la prise en compte de la capacité nécessaire pour la STEU sur le long terme pour la zone d'assainissement collectif.

Dans le cadre de cette étude, et après échanges avec le Comité de Pilotage, la **mise en œuvre d'une station de traitement de type « filtres plantés de roseaux avec une Zone de Rejet Végétalisée (ZRV) »** sera envisagée.

Le site d'implantation de la station de traitement a été validé par la commune lors de la remise de la phase 1 de l'étude.

⇒ Choix de l'ouvrage de traitement

Le choix du traitement par « filtres plantés de roseaux accompagné d'une ZRV » repose sur les nombreux avantages qu'offre cette filière, notamment sa robustesse et son adaptabilité aux contraintes locales.

Les filtres plantés de roseaux ou rhizosphères sont des excavations étanches au sol remplies de couches successives de gravier ou de sables de granulométrie variable.

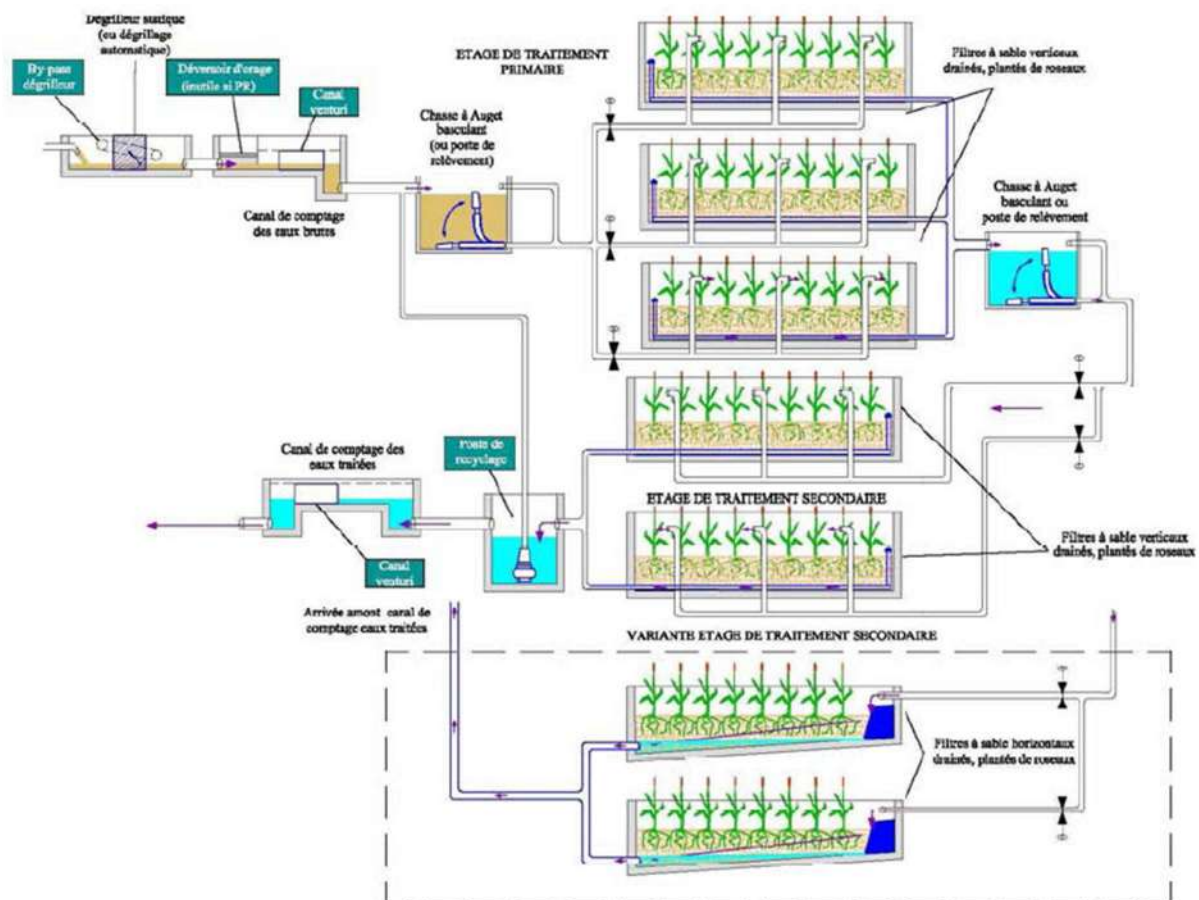


Figure 2 : Vue en coupe d'une STEU de type « filtre planté de roseaux à deux étages » (Source : Les procédés d'épuration des petites collectivités Agence de l'Eau Rhin Meuse)

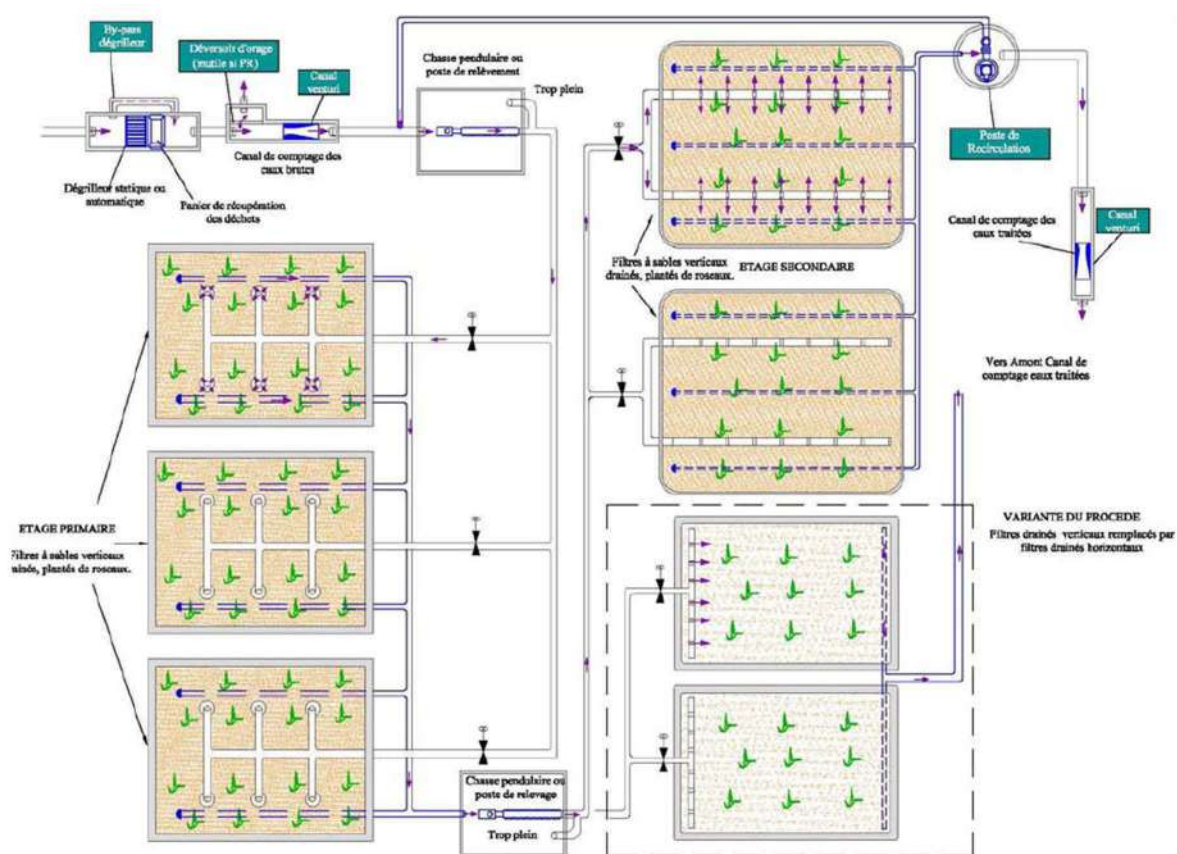


Figure 3 : Vue en plan d'une STEU type « filtre planté de roseaux à deux étages » (Source : Les procédés d'épuration des petites collectivités Agence de l'Eau Rhin Meuse)

L'ouvrage ne nécessite pas d'alimentation électrique lorsque la topographie est favorable au fonctionnement hydraulique du circuit. En revanche, dans le cas d'une topographie défavorable, la mise en place d'un poste de relevage à l'entrée de la STEU sera préconisée.

En effet, la filière de traitement pourrait s'abstenir d'un poste de relevage lorsque le transfert des effluents vers la station de traitement se fait par refoulement depuis le bourg. Dans le cas contraire, un poste de relevage pourra être requis.

Le filtre planté de roseaux est reconnu pour sa grande fiabilité en matière de traitement des eaux usées, même dans des conditions de fonctionnement variables. Ce procédé est capable de supporter des fluctuations de charges hydrauliques et organiques sans compromettre ses performances épuratoires. Sa conception, qui repose sur des mécanismes naturels tels que l'adsorption, la filtration et l'action bactérienne, garantit un traitement efficace des polluants.

Les filtres plantés de roseaux sont parfaitement adaptés aux petites et moyennes capacités (entre 40 et 1 000 EH), comme celle prévue pour la commune.

La fiabilité de cette filière se reflète également dans ses faibles coûts de fonctionnement. Contrairement à d'autres systèmes nécessitant des équipements électromécaniques complexes, le système n'a besoin que d'un entretien minimal, principalement axé sur le contrôle des flux hydrauliques et le nettoyage périodique des roseaux. Cette simplicité en fait une solution durable et économique pour une petite commune (c'est le cas ici < 500 EH).

En outre, le milieu récepteur, à savoir le *ruisseau du Ménil* (masse d'eau FRCR314), exige un traitement performant pour atteindre les objectifs de « bon état écologique et chimique » en 2027 fixés par le SDAGE Rhin-Meuse. Les filtres plantés permettent d'atteindre des rendements épuratoires satisfaisants pour les matières en suspension (MES), la demande biologique en oxygène (DBO5) et la demande chimique en oxygène (DCO), respectant ainsi les exigences de l'arrêté du 31 juillet 2020.

Afin d'éviter le déclassement de la masse d'eau, il est impératif de garantir une charge polluante compatible avec la capacité d'auto-épuration du cours d'eau, notamment en période d'étiage. Cela implique le respect du ratio de dilution réglementaire (au minimum 5:1 entre le débit du cours d'eau en étiage et le débit du rejet) et l'absence d'impact significatif sur les paramètres biologiques (macroinvertébrés, diatomées) et physico-chimiques (oxygène dissous, température, pH). Toute dégradation ou aggravation de l'état du cours d'eau, en violation du principe de non-détérioration de la DCE (article L.212-1 du Code de l'environnement), serait susceptible d'entraîner un refus d'autorisation ou des prescriptions renforcées.

Les filtres plantés de roseaux présentent plusieurs atouts techniques et fonctionnels qui en font une solution pertinente pour des petites collectivités. Sur le plan du traitement, ils assurent de bons rendements pour l'élimination de la matière organique et permettent une nitrification partielle de l'azote. Leur adaptabilité aux variations de charge constitue également un avantage majeur. Ces ouvrages s'ajustent efficacement aux fluctuations des charges hydrauliques et organiques, ce qui les rendent adaptés aux variations saisonnières ainsi qu'aux pics de charge. Leur simplicité d'exploitation est un autre point fort, puisqu'ils ne nécessitent pas de prétraitement complexe. Un simple dégrillage suffit et leur entretien reste relativement simple. Par ailleurs, ils génèrent une faible production de boues, celles-ci étant minéralisées in situ, ce qui réduit considérablement la fréquence des curages des bassins, avec une capacité de stockage estimée sur 10 à 15 ans. De plus, leur intégration paysagère constitue un facteur d'acceptabilité sociale non négligeable, car ils s'insèrent harmonieusement dans le milieu naturel et contribuent à une meilleure perception par les riverains.

En revanche, les filtres plantés présentent certaines limites qu'il convient de prendre en considération lors de leur conception et de leur dimensionnement. Ils requièrent une emprise foncière importante, avec une surface au sol comprise entre 1 et 2,5 m² par équivalent-habitant pour le traitement primaire et jusqu'à 10 m²/EH pour un site complet. Ils sont également soumis à une sensibilité au colmatage : bien que les rhizomes des roseaux contribuent à réduire ce phénomène, un entretien régulier reste indispensable, surtout en présence de charges organiques élevées. Leur performance reste limitée vis-à-vis de certains polluants, notamment pour le phosphore total et les nitrates, qui nécessitent des traitements complémentaires pour atteindre les seuils réglementaires. Enfin, ces systèmes dépendent fortement des conditions climatiques : leurs performances peuvent être réduites en cas de sécheresse prolongée ou d'événements pluvieux extrêmes.

Une Zone de Rejet Végétalisée (ZRV) est également proposée en complément de la STEU, pour renforcer encore l'efficacité globale du système. Elle permet de finaliser le traitement en éliminant les éventuels résidus de polluants et en affinant la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel. La ZRV contribue également à réduire les impacts hydrauliques et écologiques sur le milieu, répondant ainsi aux enjeux de préservation des écosystèmes aquatiques.

Néanmoins, les ouvrages de traitement collectif envisagés devront être en adéquation avec l'objectif de « bon état écologique et chimique » de la masse d'eau réceptrice, et leurs performances épuratoires devront respecter l'arrêté du 10 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2020 et l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif.

En tout état de cause, et dans l'hypothèse du choix d'un mode d'assainissement collectif sur la commune, le procédé et le site de traitement devront être définis précisément lors des études de projet.

b) Réseaux d'Eaux Usées (EU)

En raison de la vétusté des réseaux d'eaux pluviales (EP) existants et de leur configuration particulière sur la majorité du territoire communal (réseaux drainant des bassins versants en amont via des fossés, réseaux peu visitables), le taux d'eaux claires parasites (ECP) transitant dans ces ouvrages ne peut être accepté dans une éventuelle station de traitement des eaux usées (STEU). Par conséquent, **il sera nécessaire de créer de nouveaux réseaux d'eaux usées (EU) dans le cadre d'un projet d'assainissement collectif.**

Les **travaux d'assainissement** incluront, d'une part, ceux **réalisés sur domaine privé, à la charge des particuliers, pour centraliser les eaux usées vers une boîte de branchement**, et d'autre part, ceux **réalisés sur domaine public, à la charge du maître d'ouvrage (commune).**

Les travaux à la charge du maître d'ouvrage comprennent alors l'ensemble du système restant, soit la mise en place de la boîte de branchement, son raccordement au collecteur principal, ainsi que l'ensemble des équipements nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau et l'évacuation des effluents vers la future STEU.

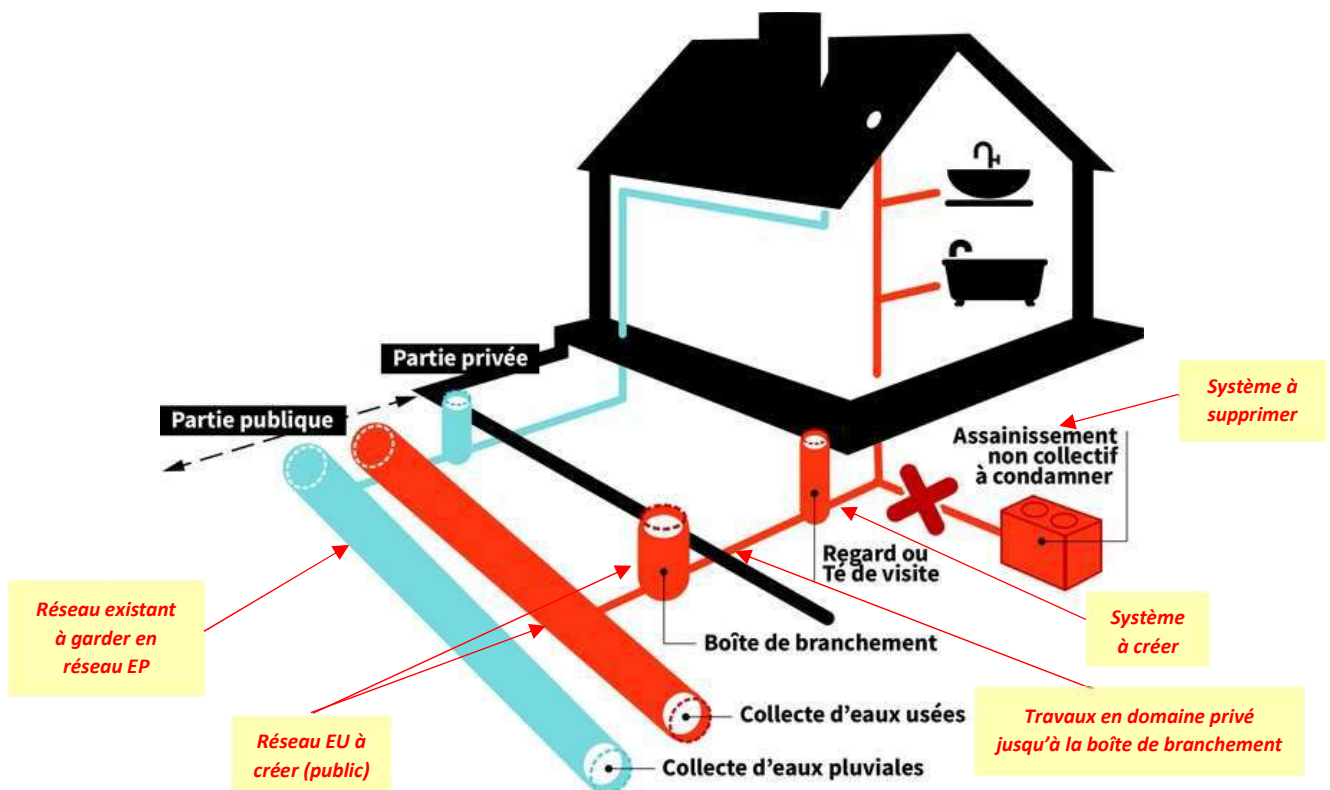


Figure 4 : Système de collecte pour l'assainissement collectif (source : CC Haut Val de Sèvre)

2. Prix unitaires utilisés pour les coûts d'investissement

2.1 Assainissement non-collectif

L'analyse visuelle sur la totalité des immeubles de la commune a été réalisée dans le but de préciser la faisabilité d'une mise en place d'un système d'ANC, selon les solutions techniques et réglementaires qui s'offrent aujourd'hui aux propriétaires.

Un « Coefficient Spécifique de Difficulté » (C.S.D.) a été attribué pour chaque immeuble (cf. rapport de phase 1), selon les contraintes identifiées. A cette occasion, l'ensemble des immeubles a été analysé et le coût de la réhabilitation de l'assainissement non collectif, selon les normes techniques et la réglementation actuelle, a été évalué pour chacun d'eux. Néanmoins, dans le cadre d'une étude de zonage d'assainissement, ces appréciations sur les difficultés propres à chaque construction sont à considérer sur toute la commune afin de définir un prix moyen représentatif de la réalité.

Les estimations financières ci-après prennent donc en compte le coût de réhabilitation évalué selon un Coefficient Spécifique de Difficulté (C.S.D) moyen ainsi que l'état actuel de l'assainissement existant suivant la synthèse des contrôles du SDANC 88.

Remarque : Pour les immeubles qui n'ont pas été contrôlés par le SDANC 88 (immeubles en **Magenta** en annexe 1), une évaluation des coûts de réhabilitation de l'assainissement non collectif a été faite à partir de simples observations de terrain, c'est-à-dire le C.S.D. affecté à l'immeuble, sans considération de l'état de l'ANC existant (soit l'hypothèse contraignante de son inexistence).

Pour ces immeubles, le coût de réalisation des dispositifs d'assainissement non collectif sera évalué pour un « **logement type** » de **taille moyenne, comprenant 5 pièces principales** (3 à 4 chambres à coucher et capacité d'accueil maximale de 5 EH).

- Fosse « toutes eaux » de 3 m³
Fourniture et pose en € HT 1 800
- Dispositif d'épuration en € HT
25 m² de filtre à sable vertical drainé 25 x 160 € HT 4 000
Filtre compact (filtre à coco, filtre à laine de roche, ...) 7 000
Micro-station d'épuration 6 500
- Plus-value pour étanchéité du fond et des parois d'un filtre à sable (pose d'un film imperméable)
Forfait en € HT 500
- Travaux de liaisons entre l'habitation et le système d'assainissement comprenant la fourniture et la pose des canalisations
Forfait en € HT 1 500
- Frais annexes dont l'estimation ne peut être déterminée quantitativement à ce stade de l'étude (transformation et séparation des évacuations d'EU existantes, pièces spéciales, ventilation de fosse, regards de visite et rehausses, remise en état du terrain, etc.
Frais de 20% du coût de l'installation complète 20%

En effet, l'analyse financière des travaux réalisés sur de précédentes opérations de réhabilitation de l'assainissement non collectif nous permet d'évaluer ce poste à environ 20% du coût de l'installation complète. Les coûts de base par filière sont les suivants :

Tableau 3 : Coûts unitaires par filière ANC

Identifiant filière	FILIERE	COÛT UNITAIRE APPLIQUE
F.T.	Filtre à sable vertical drainé et étanché 7 800 € HT x 1,20	9 400 € HT / unité
F.C.	Filtre compact 8 500 € HT x 1,20	10 200 € HT / unité
M.S.	Micro-station d'épuration 8 000 € HT x 1,20	9 600 € HT / unité

Chiffrage de l'ANC :

- ⇒ Immeubles classés **P1, P2, P5 et P6** concernés par la mise en place d'un système complet ;
- ⇒ Mise en œuvre d'un système complet sera projetée pour tout immeuble non-visité (**N.V.**)
- ⇒ Immeubles classés en **P3** nécessiteront des travaux légers (ventilation de fosse, dégagement ou remplacement de regards, etc...) pour la mise en conformité de leur système. Un **coût forfaitaire de 1500 € H.T. sera appliqué.**
- ⇒ Les immeubles classés en **P4** ne nécessiteront **aucuns travaux.**

$$\text{Coût de mise en conformité ANC} = \text{Coût Unitaire} \times \text{C.S.D.} \times \text{C.Conformité}$$

Avec :

- **Coût selon la filière (F.T, F.C ou M.S)** - cf. annexe 1 et tableau précédent ;
- **C.S.D** déterminé lors de l'analyse de l'habitat - cf. annexe 1 ;
- **C.Conformité** en pourcentage (sauf pour les « **P3** » avec un coût forfaitaire) - taux de réhabilitation projetée selon les contrôles du SDANC 88, ci-dessous :

Tableau 4 : Classification des conformités réglementaires (SDANC 88) et taux de travaux concerné

Description de l'état de conformité	Code conformité ANC	C.Conformité
Installation non conforme Travaux obligatoires sous 4 ans, (1 an si vente, par l'acquéreur)	P1	100%
Installation non conforme Uniquement si vente (dans l'année, par l'acquéreur)	P2	100%
Installation conforme Recommandations d'amélioration du système	P3	Forfait 1500 € H.T.
Installation conforme - Pas de travaux	P4	0%
Installation non conforme Travaux dans les meilleurs délais (Pas d'informations sur l'ANC)	P5	100%
Installation non conforme Travaux dans les meilleurs délais	P6	100%
Installation non visitée Pas de contrôle au 31 août 2024	N.V.	100%

2.2 Assainissement collectif

En tenant compte du contexte local de la réalisation des travaux, les coûts unitaires suivants seront pris en compte à partir des indications recueillies sur des opérations similaires. Les coûts de réhabilitation des collecteurs existants seront évalués au cas par cas.

Tableau 5 : Coûts unitaires pour les travaux d'assainissement collectif

TRAVAUX	COUT UNITAIRE
Réseau de collecte des eaux usées sous voirie à circulation moyenne (communale ou départementale)	380 € HT / ml
Réseau de collecte des eaux usées en terrain naturel (ou hors voirie)	200 € HT / ml
Moins-value pour pose de canalisations en tranchée commune	- 50 € HT / ml
Plus-value pour pose de canalisations avec surprofondeur (P>2,00m)	+ 50 € HT / ml
Branchement particulier « eaux usées » sur domaine public jusqu'en limite de propriété privée	2 500 € HT / unité
Raccordement sur domaine privé (reprise des sorties d'eau usées)	3 000 € HT / unité
Poste de refoulement de petite capacité	30 000 € HT / unité
Poste de refoulement de capacité moyenne	40 000 € HT / unité
Poste de refoulement de grande capacité	50 000 € HT / unité
Conduite de refoulement sous voirie	180 € HT / ml
Conduite de refoulement en terrain naturel	150 € HT / ml
Passage sous cours d'eau (fonçage)	12 000 € HT / unité
Coût suivant la capacité (EH) : Station de traitement par « lits plantés de roseaux à deux étages, avec poste de relevage en tête de station » (y compris dégrilleur, aménagement, ZRV, etc.).	Fonction (EH) = -0,73171 x EH ² + 1829,27 EH
Poste de relevage en tête de station de traitement (selon la topographie du site et la profondeur du réseau de transfert.	30 000 € HT / unité
Achat parcelle pour site de traitement (cas d'absence de terrain communal)	5 € HT / m ²
Achat parcelle agricole pour site de traitement (cas d'absence de terrain communal)	10 € HT / m ²

Le coût de base appliqué pour le chiffrage de la STEU est déterminé selon une fourchette (min. 1 500 € HT / EH et max. 1 800 € HT / EH). Grâce à cette base, un graphique permettant l'estimation d'une STEU selon sa capacité a été établi.

Le coût de construction d'une STEU est variable en fonction de la capacité de traitement prise en compte, comme présenté dans le graphique suivant :

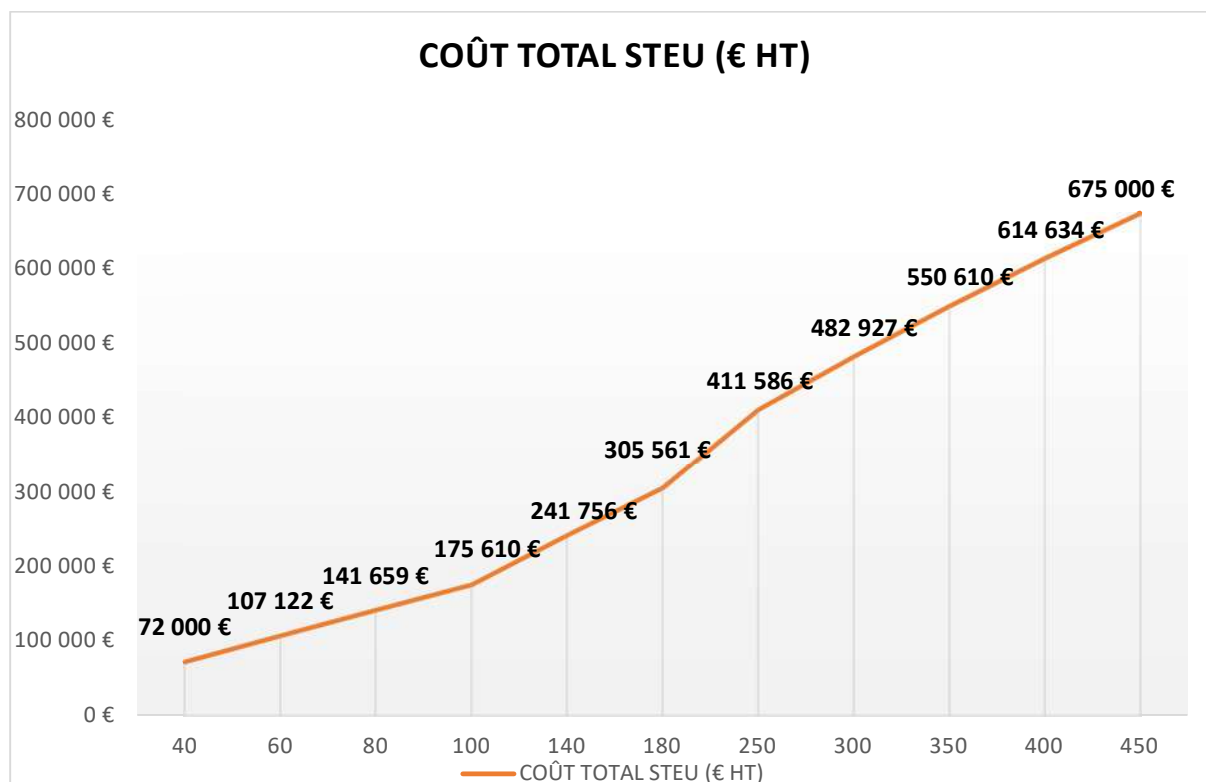


Figure 5 : Evolution du coût d'une STEU en fonction de sa capacité de traitement exprimée en EH

La formule utilisée pour l'évaluation du coût de construction d'une STEU est la suivante :

$$Y (EH) = -0,73171 X^2 + 1829,27 X$$

$$\text{COÛT TOTAL STEU} = -0,73171 \times (\text{Nb des EH})^2 + 1829,27 \times (\text{Nb des EH})$$

Remarque :

Le chiffrage de la STEU n'est que théorique, sur la base du coût minimum et maximum connus dans la littérature.

Des contraintes locales (présence de roche, de nappes affleurantes, etc.) peuvent influencer le coût réel du projet. Parallèlement, un terrain favorable (remblais réutilisable, topographie favorable, etc.) peut faire diminuer le coût de construction d'une STEU. C'est pourquoi le graphique ci-dessus n'est qu'indicatif, permettant l'évaluation du scénario d'assainissement collectif au scénario d'assainissement non-collectif.

Le coût des travaux de raccordement des immeubles sur domaine privé est inclus dans les estimations financières à des fins de comparaison objective des différents scénarios proposés. Cependant, il faut rappeler ici que ces coûts devraient être laissés à la charge des particuliers lors de l'exécution des travaux.

3. Prix unitaires pour les charges d'exploitation

3.1 Assainissement non-collectif

a) Généralités

Une installation d'assainissement non collectif, même bien conçue et bien réalisée ne peut donner satisfaction que si son entretien est régulier et systématique.

Cet entretien sera adapté à chaque type d'installation. Il vise à garantir un niveau satisfaisant d'épuration, à assurer la pérennité du dispositif ainsi qu'au confort de l'utilisateur.

Le suivi d'une installation consiste en deux types d'opération, à savoir la surveillance (ou contrôle) et l'entretien. La surveillance s'exerce au cours d'inspections systématiques de contrôle à tous les niveaux de la filière : ouvrages de prétraitement, regards de visite (répartition, collecte, accès au système d'épuration pour les filtres compacts, etc.).

- ✓ **Filières traditionnelles (F.T) :** l'entretien consiste à la vidange complète des ouvrages de prétraitement. Elle nécessite l'emploi d'un appareillage spécialisé. Le volume des ouvrages de prétraitement étant dimensionné en rapport avec le nombre d'utilisateurs potentiels, la fréquence des vidanges peut donc être établie de manière fixe pour chaque installation

La fosse toutes eaux, élément majeur de l'installation, doit être vidangée lorsque la hauteur de boue dépasse 50% de la hauteur utile de la fosse (en général tous les 4 ans) et aussitôt remise en eau claire.

Remarque : En fonction de la taille et du mode d'occupation des immeubles, des fréquences de vidange plus rapprochées sont parfois nécessaires. Celles-ci devront être décidées lors des visites régulières de contrôle.
--

- ✓ **Filtre compact (F.C) :** à cette vidange périodique des ouvrages s'ajoutent **une maintenance régulière et le remplacement du matériau filtrant en moyenne tous les 8 à 10 ans.**
- ✓ **Micro-station d'épuration (M.S) :** nécessitent également une vidange périodique (décanteur). De plus, **des opérations de maintenance et d'entretien sont également nécessaires très régulièrement** (visites de contrôle, remplacement des pièces d'usure, etc...).

Remarque : Généralement, la garantie du bon fonctionnement et du rendement épuratoire de telles installations passe par la signature d'un contrat d'entretien avec le fabricant.
--

b) Estimation financière

○ **Contrôles des dispositifs d'assainissement non collectif**

Les contrôles de surveillance doivent être effectués dans le cadre du service public d'assainissement non collectif, conformément aux modalités de contrôle décrites dans l'arrêté du 27 avril 2012. Le SDANC 88 exerce la mission de service public du contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif sur la commune.

Le coût pour un contrôle périodique de bon fonctionnement est de 120 € HT (donnée pour 2025). La fréquence de ces visites est de 10 ans en moyenne. Ainsi, le coût retenu pour la suite des estimatifs est le suivant :

- **Visite de contrôle périodique**

120 € HT / 10..... 12 € HT / an

○ **Coût d'exploitation des filières traditionnelles (FT) et des filtres compacts (FC)**

Les vidanges des ouvrages de prétraitement (extérieurs ou intégrés aux filtres) nécessitent l'intervention d'appareils spécialisés, comme le camion mixte vidangeuse-hydrocureuse de l'entreprise agréée. L'intervention d'un vidangeur professionnel est donc obligatoire. Elle offre en contrepartie une protection et un recours en garantie en cas d'incident.

Les interventions d'un prestataire de service doivent être régies sur les bases de relations contractuelles précises avec la collectivité. En système de gestion communale directe, avec prestation de service sous-traitée à un vidangeur, **on admettra un coût d'intervention de 300 € HT pour une vidange, soit une vidange moyenne⁴ de 3 m³.**

Ce coût inclut l'évacuation des eaux usées par le vidangeur, conformément aux exigences réglementaires, ainsi que les opérations de curage des canalisations de liaison et des regards. Pour une fréquence de vidange estimée à 4 ans dans le cas des filtres compact et des filières traditionnelle (fosse individuelle), le coût moyen annuel serait de :

- **Vidange de la fosse septique « toutes eaux » de 3 m³**

300 € HT / 4..... 75 € HT/ an

D'autre part, les filtres compacts nécessitent en supplément une maintenance régulière (nettoyage et réglage du système de répartition, scarification de la surface du matériau filtrant, etc.) et surtout un remplacement à plus ou moins long terme du matériau filtrant, tels que le coco, la laine de roche, etc...

Nous avons pris dans nos estimations une fréquence de remplacement du matériau de l'ordre de 10 ans, selon les indications des principaux fabricants.

- **Maintenance régulière y compris remplacement du matériau filtrant (filtres compacts)**

2 000 € HT / 10 200 € HT/ an

⁴ Vidange moyenne : Une fosse toutes eaux doit présenter un volume minimal de 3 m³ jusqu'à 5 pièces principales, puis de 1 m³ supplémentaire par pièce principale supplémentaire. – info sur : <https://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/>

○ **Coût d'exploitation des microstations d'épuration (MS)**

Pour ces installations, les opérations d'entretien concerneront en particulier les équipements électromécaniques, et le nettoyage périodique des dispositifs de prétraitement, auxquelles il faudra ajouter. **La vidange est effectuée lorsque les boues atteignent 30 % de la hauteur utile du décanteur. En comparant les différents types de microstations agréées, on constate que le coût annuel moyen de vidange annoncée par les constructeurs est de l'ordre de 100 € HT.**

Le coût moyen annuel de fonctionnement d'une microstation peut être estimé à :

- **Maintenance et entretien réguliers d'une microstation d'épuration (prix appliqué par le SDANC 88 pour les communes adhérentes dont celles de la 2C2R)**
 Forfait annuel en € HT 100 € HT

c) **Coûts de fonctionnement des dispositifs ANC**

Le tableau suivant synthétise le coût total annuel de fonctionnement des filières ANC prévues au niveau de la commune :

Tableau 6 : Synthèse des coûts de fonctionnement des dispositifs ANC

	Filière traditionnelle (F.T)	Filtre Compact (F.T)	Microstation (MS)
Contrôle périodique (€ HT / an)	12	12	12
Vidange annuelle (€ HT / an)	75	75	100
Maintenance (€ HT / an)	-	200	100
Coût d'exploitation (€ HT / an)	87	287	212

Remarque : Il faut rappeler à ce propos que seule la prise en charge du contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif constitue une obligation pour la collectivité (dans le cadre du SPANC).

En ce qui concerne l'entretien des dispositifs, la collectivité a deux alternatives : soit assurer un service d'entretien (qui devra rester facultatif pour l'utilisateur), soit laisser cette charge aux particuliers concernés.

Toujours dans le but de pouvoir comparer objectivement les différents scénarios proposés sur la commune, nous tiendrons compte de la première hypothèse (exploitation à la charge de la commune) dans les estimations financières suivantes.

3.2 Assainissement collectif

a) Généralités

L'entretien des dispositifs appartenant à la collectivité nécessite la mise en place d'un service public bien spécifique. De nos jours, la collectivité dispose d'une panoplie de solutions :

- l'installation d'une régie municipale ou syndicale,
- le recours à des sociétés tiers, en affermage, ou encore concessionnaires.

Les charges liées à l'entretien peuvent être divisées en 3 postes principaux :

- les réseaux de collecte,
- les postes de relevage ou de refoulement,
- les unités de traitement.

La commune exerce la compétence « assainissement collectif » et la compétence « assainissement non collectif » a été déléguée au SDANC 88.

La commune mettra en œuvre toutes les dispositions nécessaires à l'exploitation et à la gestion des systèmes d'assainissement collectif qui pourraient être mis en place à la suite de l'approbation de la mise à jour du zonage d'assainissement.

b) Estimation financière

○ Entretien des réseaux

Pour un réseau gravitaire, les besoins d'entretien consistent généralement en un curage **tous les cinq ans** et le nettoyage des boîtes de branchement tous les deux ans environ.

Le coût de ces opérations est basé sur les coûts unitaires suivants :

- ⇒ Curage du réseau : **5 € HT le mètre linéaire, soit 1,00 € HT/an/ml ;**
- ⇒ Nettoyage des boîtes de branchement **tous les deux ans à 10 € HT l'unité, soit 5 € HT/an/B.B.**

○ Entretien des postes de refoulement (PR)

Les réseaux de collecte sont réalisés de manière à permettre un écoulement gravitaire, dans la mesure du possible. En cas de non-possibilité, un poste de refoulement / relevage est requis.

Ces ouvrages nécessitent un entretien régulier incluant les opérations de dégrillage et de vidange de l'ouvrage, ainsi qu'un coût de fonctionnement, soit la consommation électrique et la maintenance. Ces coûts peuvent être variables selon la capacité des postes de refoulement. Le tableau suivant détaille les coûts de fonctionnement pour trois catégories de capacité :

Tableau 7 : Coûts de fonctionnement annuels des postes de relevage (ou de refoulement)

Entretien et fonctionnement d'un poste de refoulement	Petite capacité ≤ 100 EH	Forfait	2 000,00 €
	100 EH < Moyenne capacité < 200 EH		3 000,00 €
	Grande capacité ≥ 200 EH		4 500,00 €

- Entretien des unités de traitement
 - Filtres plantés de roseaux (ou rhizosphère)

Le procédé d'épuration par rhizosphère est relativement rustique et ne nécessite qu'un entretien limité. En revanche, cet entretien est primordial pour assurer un bon fonctionnement des ouvrages. L'entretien général des ouvrages correspond à des travaux de type « jardinage » (fauchage, entretien des abords, nettoyage des regards...) et surtout à une surveillance du bon fonctionnement du système.

Par ailleurs, il est également prévu un fauchage annuel des roseaux. Cette opération peut être réalisée simplement à la débroussailleuse. Pour des ouvrages de la taille de ceux envisagés pour le traitement des effluents collectés sur la commune. Un passage sur site d'environ 1 à 2 heures par semaine devrait être suffisant. Le coût de ces opérations varie selon la capacité de la STEU, c'est-à-dire sa taille et la superficie des étages des filtres.

Les boues issues du 1er étage de l'installation sont compostées sur place et doivent être évacuées environ tous les 10 ans, à raison de 0,15 m³ par équivalent-habitant. Valorisables en agriculture sous condition d'un plan d'épandage, leur évacuation coûte en moyenne 30 € HT/m³, soit environ 0,45 € HT/EH, un coût intégré aux forfaits d'exploitation.

Le coût de fonctionnement des STEU est plus élevé lorsqu'il existe un poste de relevage en tête de station, nécessitant un entretien régulier et une alimentation électrique. Les opérations nécessaires ont été évaluées et estimées en coûts annuels comme suit :

Tableau 8 : Coût de fonctionnement des STEU selon leurs équipements et capacités

Poste de coût	≤ 100 EH	≤ 199 EH	≤ 400 EH
Énergie et entretien d'un poste de relevage	1 300 €	1 800 €	2 500 €
Fauche / entretien végétal	600 €	700 €	1 000 €
Nettoyage des prétraitements	400 €	500 €	700 €
Autosurveillance / analyses	0 €	0 €	500 €
Maintenance réseaux, regards	200 €	500 €	600 €
Passage agent (alternance vannes 2x/semaine)	2 500 €	3 000 €	4 000 €
Total	3 700 à 5 000 €	4 700 à 6 500 €	6 800 à 9 300 €

Les coûts de fonctionnement des STEU sont synthétisés dans le tableau suivant :

Tableau 9 : Synthèse des coûts de fonctionnement des STEU

Entretien et exploitation d'une STEU	STEU ≤ 100 EH	Sans PR	Forfait	3 700 €
		Avec PR		5 000 €
	100 EH < STEU < 200	Sans PR		4 700 €
		Avec PR		6 500 €
	STEU > 200 EH	Sans PR		6 800 €
		Avec PR		9 300 €
Contrôle <u>obligatoire annuel</u> des performances de la STEU (bilan 24H) + cahier de vie	STEU > 199 EH		Forfait	1 000 €

Remarque : Selon l'arrêté ministériel du 31 juillet 2020, pour une capacité nominale d'une station d'épuration > 12 kg DBO5/j et < 30 kg DBO5/j (> 200 EH jusqu'à 500 EH compris, cas de la commune de CLEZENTAIN), la mise en place de l'autosurveillance sera nécessaire, avec un contrôle des performances de la future station d'épuration par bilan 24h tous les 2 ans. **Le coût de ces mesures et analyses d'effluents est à la charge de la collectivité gestionnaire de l'ouvrage. Il peut être évalué à environ 1 000 € HT par bilan.**

▪ Zone de Rejet Végétalisée (ZRV)

Pour la ZRV à prévoir à l'aval des filtres, aucun entretien particulier n'est prévu hormis un débroussaillage de la zone (inclus dans le forfait).

IV - ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE DES SCENARIOS D'ASSAINISSEMENT

Dans le cadre de l'étude financière, deux scénarios de mise en conformité de l'assainissement communal ont été analysés. La première repose sur des solutions d'ANC adaptées à chaque parcelle, en tenant compte de la situation actuelle et des contraintes spécifiques aux immeubles. Le second envisage un assainissement collectif, basé sur le même nombre de logements pour permettre une comparaison cohérente, avec une station d'épuration dimensionnée pour les potentiels immeubles en zone d'assainissement collectif.

1. Scénario 1

1.1 Assainissement Non Collectif

Le Zonage d'Assainissement Non Collectif (ANC) concerne l'ensemble de la commune.
 L'assainissement non collectif concerne donc dans ce schéma **108 immeubles**.

D'après les résultats des contrôles réglementaires effectués par le SDANC 88, il existe :

Tableau 10 : Etat de conformité de l'ANC (source : résultats des contrôles du SDANC 88)

Description de l'état de conformité	Conformité ANC	Nombre immeubles
Installation non conforme Travaux obligatoires sous 4 ans, (1 an si vente, par l'acquéreur)	P1	5
Installation non conforme Uniquement si vente (dans l'année, par l'acquéreur)	P2	53
Installation conforme Recommandations d'amélioration du système	P3	9
Installation conforme - Pas de travaux	P4	7
Installation non conforme Travaux dans les meilleurs délais (Pas d'informations sur l'ANC)	P5	6
Installation non conforme Travaux dans les meilleurs délais	P6	18
Installation non visitée Pas de contrôle au 31 août 2024	N.V.	10
Total		108

Les immeubles classés en **P1**, **P2**, **P5** et **P6** nécessitent généralement une réhabilitation totale du système s'il est existant, ainsi que les immeubles qui n'ont pas été visités par le SDANC 88.

A partir des observations de terrain, notamment l'examen visuel de l'habitat et des contrôles du SDANC 88, **7 immeubles ont été classés en P4 « pas de travaux » et possèdent donc une filière conforme, 9 autres immeubles, classés en P3, disposent d'un système ANC « conforme mais nécessitant quelques travaux légers ».**

Pour les 92 immeubles non conformes ou non visités, ils seront équipés de filières de traitement dont la répartition devrait être la suivante :

Tableau 11 : Répartition des filières ANC à mettre en œuvre

Filière traditionnelle (Bac à graisse* + Fosse toutes eaux + filtre à sable, etc.)	9 unités
Filtre compact	35 unités
Microstation d'épuration	48 unités

* Recommandé lorsque la longueur de la canalisation entre l'habitation et la fosse toutes eaux dépasse 10 mètres.

Estimation financière pour les 108 immeubles de la commune

Un Coefficient moyen Spécifique de Difficulté pour la réhabilitation des systèmes ANC a été estimé pour chaque type de filière à mettre en œuvre (hors ERP ou établissement particulier), d'après les observations faites sur le terrain pendant l'examen visuel de l'habitat.

Tableau 12 : Chiffrage du Scénario 1 - mise en conformité des dispositifs ANC

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Produit en € HT	Fonctionnement en € HT
Réhabilitation totale de l'ANC pour les immeubles classés "non conformes" ET " non visités"					
Filière traditionnelle CSD moyen	u	9	9 400,00 €	84 600,00 € 17%	783,00 €
Sous-total				99 000,00 €	
Filtre compact CSD moyen	u	34	10 200,00 €	346 800,00 € 19%	9 758,00 €
Sous-total				412 700,00 €	
Micro-station CSD moyen	u	48	9 600,00 €	460 800,00 € 24%	10 176,00 €
Sous-total				571 400,00 €	
Sous-Total en € HT				1 083 100,00 €	20 717,00 €
Réhabilitation des établissements particuliers ANC Salle polyvalente (n°36)					
Filtre compact (16 EH) (170%) CSD	u	1	18 000,00 €	18 000,00 € 170%	870,00 €
Sous-total				48 600,00 €	
Sous-Total en € HT				48 600,00 €	870,00 €
Réhabilitation de l'ANC des immeubles classés " conformes avec travaux légers"					
Immeubles classés en P3	Forfait	9	1 500,00 €	13 500,00 €	1 608,00 €
Sous-Total en € HT				13 500,00 €	1 608,00 €
Immeuble classés conformes (pas de travaux)					
Immeubles classés en P4	u	7	0,00 €	- €	1 534,00 €
Sous-Total en € HT				0,00 €	1 534,00 €
Nombre total d'immeubles en "ANC conforme" après travaux			108		
TOTAL en € HT				1 145 200,00 €	24 729,00 €
Coût moyen par immeuble en € HT				10 603,70 €	228,97 €

1.2 Assainissement collectif

Le scénario 1 ne prévoit pas la mise en place de système d'assainissement collectif.

1.3 Synthèse

Le tableau suivant synthétise les coûts d'investissement et de fonctionnement relatifs au scénario 1.

Tableau 13 : Synthèse des coûts du scénario 1

	Assainissement non collectif	Assainissement collectif	Assainissement communal
Nombre d'immeubles	108	0	108
Investissement total (€ HT)	1 145 200,00 €	0,00 €	1 145 200,00 €
Ratio coût d'investissement (€ HT/immeuble)	10 603,70 €	0,00 €	10 603,70 €
Fonctionnement total (€ HT)	24 729,00 €	0,00 €	24 729,00 €
Ratio coût de fonctionnement (€ HT/ immeuble)	228,97 €	0,00 €	228,97 €

Pour le scénario 1, le **coût d'investissement s'élève à environ 1,145 M € HT** pour la mise en conformité de l'ensemble des dispositifs ANC existants à CLEZENTAIN.

Ce montant, représentant l'investissement moyen d'environ 10 600,00 €/ immeuble assaini, est plus représentatif pour des travaux à réaliser dans le cadre d'une mission de Maîtrise d'Œuvre commune (opération groupée). En effet, le coût d'investissement pourrait varier entre l'estimation ci-dessus et la réalité si les travaux sont réalisés individuellement (variation des coûts des fournisseurs et des entreprises de travaux).

Ces coûts sont à la charge du particulier. Par ailleurs, il pourrait exister des dispositifs d'aides pour la mise en conformité de l'ANC, notamment en cas d'opération groupée.

En fonction des chiffrages des solutions proposées précédemment, le **coût de fonctionnement moyen annuel estimé pour un dispositif ANC serait d'environ 230 € HT par immeuble.**

De la même manière que les coûts de mise en œuvre, le coût de fonctionnement est exclusivement à la charge du particulier.

2. Scénario 2

2.1 Assainissement Non Collectif

Dans ce second scénario, seuls 6 immeubles ci-dessous seront concernés par le **Zonage d'Assainissement Non Collectif (ANC)**.

Le tableau suivant liste les propriétés concernées, ainsi que le justificatif du choix de son maintien en ANC :

Tableau 14 : Liste des propriétés maintenues en Assainissement Non Collectif (ANC) – Scénario 2

Adresse propriété	N° immeuble	Justification du zonage ANC
4 immeubles sis, « Route de Saint-Maurice »	82, 83, 84 et 85	Nécessite la création d'une longue antenne de réseaux pour 4 immeubles, dont 2 classés P4 « conformes pas de travaux ANC » et 1 immeuble classé P3 « travaux légers ».
1 immeuble avec des contraintes (en sortie Ouest de la commune)	99	Importante pente pour un raccordement en gravitaire vers le réseau (immeuble qui pourrait être raccordé par refoulement)
1 immeuble à l'écart (au Nord de la commune)	108	Zone très éloignée pour un raccordement au réseau collectif.

Toujours à partir des observations de terrain, notamment l'examen visuel de l'habitat, et les contrôles du SDANC 88, il existe **2 immeubles classés en P4 (sans travaux)**, **un seul immeuble classé en P3 (travaux légers)** et **3 immeubles** non conformes ou non visités qui pourront être équipés de filières de traitement dont la répartition devrait être la suivante :

Tableau 15 : Répartition des filières ANC à mettre en œuvre

Filière traditionnelle (Bac à graisse* + Fosse toutes eaux + filtre à sable, tranchées d'infiltration...)	2 unités
Filtre compact	1 unités

Localisation des logements concernés par un « zonage ANC » :

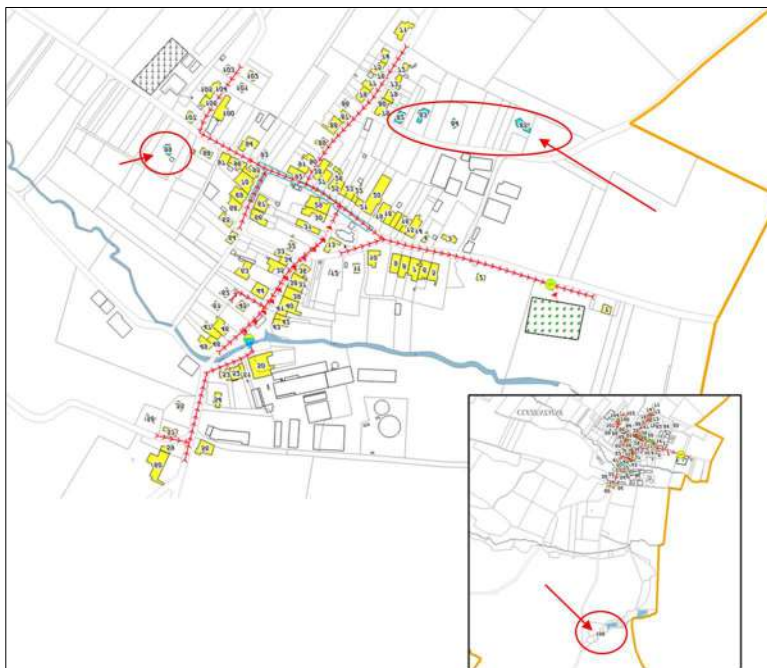


Figure 6 : Immeubles concernés par le zonage ANC dans le scénario 2

Estimation financière pour les 6 filières ANC

Tableau 16 : Chiffrage du Scénario 2 - mise en conformité des dispositifs ANC

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Produit en € HT	Fonctionnement en € HT
Réhabilitation totale de l'ANC pour les immeubles classés "non conformes" ET " non visités"					
Filière traditionnelle	u	2	9 400,00 €	18 000,00 €	174,00 €
CSD moyen				20%	
Sous-total				22 600,00 €	174,00 €
Filtre compact	u	1	10 200,00 €	10 200,00 €	287,00 €
CSD moyen				20%	
Sous-total				12 200,00 €	287,00 €
Sous-Total en € HT				34 800,00 €	461,00 €
Réhabilitation de l'ANC des immeubles classés " conformes avec travaux légers"					
Immeubles classés en P3	Forfait	1	1 500,00 €	1 500,00 €	87,00 €
Sous-Total en € HT				1 500,00 €	87,00 €
Immeuble classés conformes (pas de travaux)					
Immeubles classés en P4	u	2	0,00 €	0,00 €	374,00 €
Sous-Total en € HT					374,00 €
Nombre total d'immeubles en "ANC conforme" après travaux	6				
TOTAL en € HT				36 300,00 €	922,00 €
Coût moyen par immeuble en € HT				6 050,00 €	153,67 €

2.2 Assainissement collectif

Dans ce scénario, les secteurs collectés comprennent **102 immeubles**, soit 95% du bâti total actuel de la commune.

Le projet comprend :

- la création d'un réseau « eaux usées » gravitaire de 1 910 mètres, dont 215 mètres de pose en tranchée commune à la conduite de refoulement et 275 mètres de pose en surprofondeur,
- le raccordement de 102 immeubles,
- la mise en place d'un poste de refoulement en aval de la zone collectée, en bas de la « Rue de la Grande Fontaine », à proximité du *ruisseau du Ménil*, d'un autre poste en amont de la station de traitement et d'une conduite de refoulement d'environ 285 mètres de long pour évacuer les effluents collectés vers la station d'épuration.
- la réalisation d'une station de traitement de type « lits plantés de roseaux », dimensionnée sur la base de 270 équivalents-habitants (EH) raccordés.

Le dispositif de traitement pourra être implanté sur un terrain exploité situé à la sortie Est du village, en bordure de la route départementale n°9 avec un rejet des effluents traités vers le *ruisseau du Ménil* s'écoulant en contre bas.

La surface d'emprise à prévoir pour l'installation de l'ouvrage d'épuration serait de l'ordre de 2 800 à 3 000m². Cependant le site potentiel projeté dans le scénario collectif, devra être confirmé au niveau des études projet lors d'une mission de maîtrise d'œuvre.

Les coûts d'investissement et de fonctionnement relatifs à l'assainissement collectif pour ce scénario 2 sont donnés ci-après.

Tableau 17 : Coûts relatifs à l'assainissement collectif – Scénario 2

Coûts d'investissement				
Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix unitaire (€ HT)	Coût (€ HT)
Réseau de collecte des eaux usées sous voirie à circulation moyenne (communale ou départementale)	ml	1 745	380,00 €	663 100,00 €
Réseau de collecte des eaux usées sous terrain naturel	ml	165	200,00 €	33 000,00 €
Plus-value pour pose de canalisation à plus de 2 m de profondeur	ml	275	50,00 €	13 750,00 €
Moins-value pour pose de canalisation en tranchée commune	ml	215	- 50,00 €	- 10 750,00 €
Branchement particulier « eaux usées » sur domaine public jusqu'en limite de propriété privée	u	102	2 500,00 €	255 000,00 €
Poste de refoulement de capacité moyenne (100 à 150 EH)	u	1	40 000,00 €	40 000,00 €
Conduite de refoulement sous voirie	ml	250	180,00 €	45 000,00 €
Conduite de refoulement en terrain naturel	ml	35	150,00 €	5 250,00 €
Passage sous cours d'eau	u	1	12 000,00 €	12 000,00 €
*Station de traitement par « lits plantés de roseaux à deux étages » (y compris dégrilleur, aménagement, ZRV, etc.).	EH	270	1 635,00 €	441 500,00 €
Poste de relevage en tête de station	u	1	50 000,00 €	50 000,00 €
Achat parcelle exploitée pour site de traitement	m²	3 000	10,00 €	30 000,00 €
Sous-Total Travaux € HT				1 577 850,00 €
MOE et imprévus				10 %
SOUS-TOTAL en € HT				1 735 635,00 €
Raccordement sur domaine privé (reprise des sorties d'eau usées)	Forfait	102	3 000,00 €	306 000,00 €
TOTAL en € HT				2 041 635,00 €

Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix unitaire (€ HT/an)	Coût (€ HT/an)
<u>Collecte et transport</u>				
Entretien du réseau	ml	1 910	1,00 €	1 910,00 €
Entretien des boîtes de branchement	u	102	5,00 €	510,00 €
Entretien et fonctionnement des postes de refoulement de moyenne capacité	Forfait	1	3 000,00 €	3 000,00 €
Sous total :				5 420,00 €
<u>Traitement</u>				
Entretien et exploitation d'une STEU de capacité > 100 EH (avec poste de relevage)	u	1	9 300,00 €	9 300,00 €
Sous total :				9 300,00 €
Contrôle obligatoire des performances de la STEU (bilan 24H) et cahier de vie d'une STEU > 199 EH	Forfait	1	1 000,00 €	1 000,00 €
Sous total :				1 000,00 €
TOTAL en € HT				15 720,00 €

2.3 Synthèse

Le tableau suivant synthétise les coûts d'investissement et de fonctionnement relatifs au scénario 2.

Tableau 18 : Synthèse des coûts du scénario 2

	Assainissement non collectif	Assainissement collectif	Assainissement communal
Nombre d'immeubles	6	102	108
Investissement total (€ HT)	36 300,00 €	2 041 635,00 €	2 077 935,00 €
Ratio coût d'investissement (€ HT/immeuble)	6 050,00 €	20 016,03 €	19 240,14 €
Fonctionnement total (€ HT)	922,00 €	15 720,00 €	16 642,00 €
Ratio coût de fonctionnement (€ HT/ immeuble)	153,67 €	154,12 €	154,09 €

Pour le second scénario, le coût total d'investissement pour la mise aux normes de l'assainissement (collectif et non collectif) s'élève à près de 2,077 M €, soit environ 19 250,00 € HT en moyenne par immeuble assaini.

En fonction des analyse et chiffrages des solutions proposées précédemment, le coût de fonctionnement annuel moyen estimatif pour un système collectif et non collectif serait d'environ 155 € HT.

3. Comparatif des scénarios d'assainissement

Pour mieux comparer les deux scénarios d'assainissement étudiés sur la commune de CLEZENTAIN, le tableau ci-après reprend les coûts d'investissement et d'exploitation estimés par types de travaux pour chaque solution technique précédemment décrite.

Tableau 19 : Comparatif des coûts d'investissement et d'exploitation des différents scénarios

		SCENARIO 1	SCENARIO 2
		ANC	AC
Nombre d'immeubles en assainissement collectif		0	102
Nombre d'immeubles en assainissement non collectif		108	6
INVESTISSEMENT	<u>Réhabilitation de l'assainissement non collectif</u>	1 145 200,00 €	36 300,00 €
	<u>Mise en place d'un système d'assainissement collectif</u> (travaux sur domaine public)	/	1 735 635,00 €
	<u>Raccordement sur domaine privé (assainissement collectif)</u>	/	306 000,00 €
	COUT TOTAL en € HT	1 145 200,00 €	2 077 935,00 €
	Coût moyen par immeuble en € HT	10 603,70 €	19 240,14 €
EXPLOITATION ANNUELLE	<u>Coûts d'exploitation annuels (assainissement non collectif)</u>	24 729,00 €	922,00 €
	<u>Coûts d'exploitation annuels (assainissement collectif)</u>	/	15 720,00 €
	COUT TOTAL en € HT	24 729,00 €	16 642,00 €
	Coût moyen par immeuble en € HT/an	229,97 €	154,09 €
EXPLOITATION (CUMUL 10 ANS)	<u>Coûts d'exploitation décennal de l'assainissement non collectif</u>	247 290,00 €	9 220,00 €
	<u>Coûts d'exploitation décennal assainissement collectif</u>	/	157 200,00 €
	COUT TOTAL en € HT	247 290,00 €	166 420,00 €
	Coût moyen par immeuble en € HT / 10 ans	2 289,77 €	1 540,93 €
EXPLOITATION (CUMUL 30 ANS)	<u>Coûts d'exploitation trentennal de l'assainissement non collectif</u>	741 870,00 €	27 660,00 €
	<u>Coûts d'exploitation trentennal assainissement collectif</u>	/	471 600,00 €
	COUT TOTAL en € HT	741 870,00 €	499 260,00 €
	Coût moyen par immeuble en € HT / 30 ans	6 869,17 €	4 622,78 €

La figure suivante met en **comparaison les coûts des deux scénarios**, en **investissement** et en **fonctionnement sur une durée de 30 ans** :

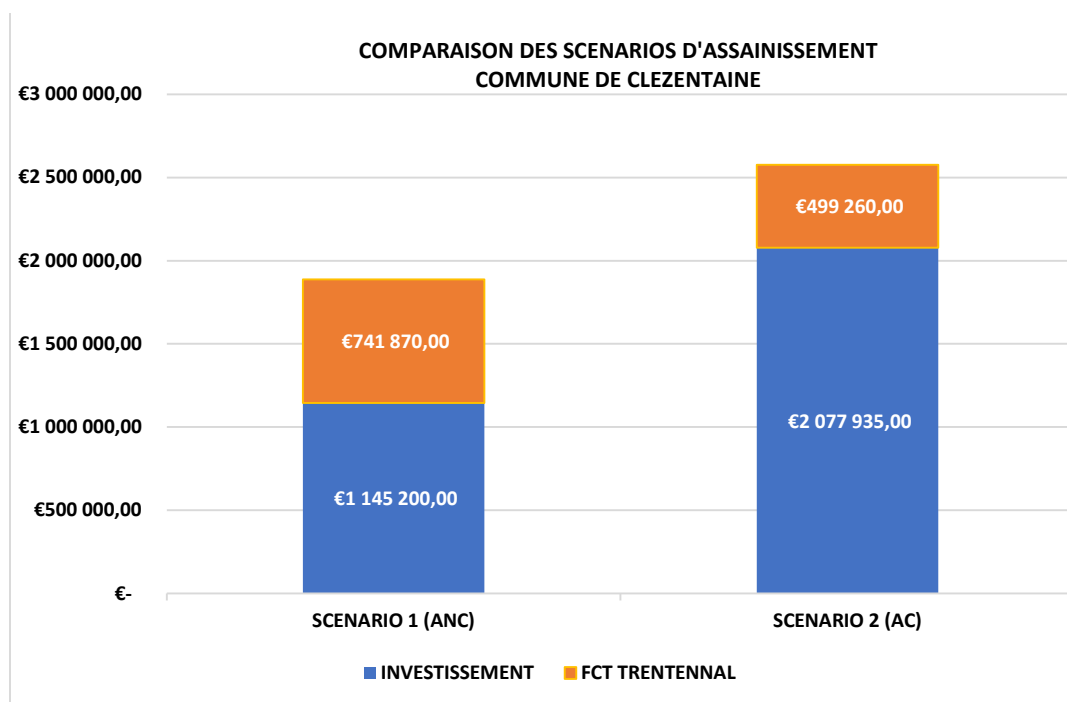


Figure 7 : Comparatif des coûts liés aux scénarios d'assainissement

Les coûts globaux estimés pour la mise en œuvre d'un système d'assainissement complet sur la commune de CLEZENTAIN (incluant aussi bien les travaux d'assainissement collectif que ceux de réhabilitation de l'assainissement non collectif sur la totalité des immeubles) varient entre 1 145 200 € et 2 077 935 € Hors Taxes suivant le scénario envisagé.

Les estimations financières précédentes montrent clairement que le coût global d'investissement augmente très fortement avec la mise en œuvre de l'assainissement collectif sur les zones urbanisées de la commune de CLEZENTAIN.

En effet, on constate un écart de près de plus de 80% entre le scénario n°1 proposant une réhabilitation de l'assainissement non collectif à l'ensemble des immeubles de la commune et le scénario n°2 prévoyant la création d'un système collectif sur une majorité des immeubles de la commune.

Les techniques évoluent, mais surtout la réglementation en matière d'assainissement non collectif autorise désormais la mise en œuvre d'ouvrages alternatifs (filtres compacts, micro-stations d'épuration) par rapport aux filières traditionnelles (épandages, filtres à sable), ces dispositifs sont encore aujourd'hui particulièrement onéreux. Néanmoins, avec la mise en place de ce type de filières spéciales, qui devraient être à envisager sur près de 87% des immeubles de CLEZENTAIN, on obtient des coûts moyens d'investissement ramenés à l'immeuble assaini inférieurs à ceux calculés pour la solution d'assainissement collectif intégrant le coût du réseau public, du raccordement sur domaine privé et du traitement collectif.

A contrario, il ressort des estimations précédentes que les coûts d'exploitation sont nettement supérieurs concernant le scénario n°1 en comparaison avec le scénario 2 (+ 32% entre le scénario 1 et le scénario 2).

4. Comparatif avec les solutions étudiées précédemment

Pour rappel, lors des études précédentes, en juin 2000, un seul scénario avait été envisagé concernant l'assainissement communal.

Pour des raisons de contraintes de pente, d'aménagement et de surface, l'assainissement non collectif n'avait pas été proposé et étudié sur la commune.

Ainsi, l'étude proposait un **réseau de collecte pour desservir 82 immeubles du village avec la construction d'une station de traitement dimensionné pour 220 EH. Le coût de ce scénario avait été estimé à l'époque à 2 342 000 francs**, soit 535 500 €uros constants, ce qui engendrait un coût d'exploitation par immeuble de **l'ordre de 6 500 €uros constants avec un coût d'entretien annuel de 400 €uros constants par habitations**.

9 logements avaient été laissés en **assainissement autonome** au vu de leur éloignement, ce qui représentait **un coût d'exploitation par immeuble de 5 800 €uros constants et un coût de fonctionnement annuel de seulement 20 €uros constants**.

5. Mode de gestion et subventions des systèmes d'assainissement

Pour information, les travaux d'assainissement éligibles aux aides de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse visent avant tout l'atteinte du bon état de la Masse d'Eau (rivière), dont la commune dépend.

Pour cela, l'Agence étudiera le projet présentant le meilleur compromis technico-économico-environnemental, intégrant les coûts d'investissement et de fonctionnement. L'Agence de l'Eau pourra ainsi venir plafonner le montant retenu pour le calcul de son aide, aux projets ou aux seules opérations du projet, qui permettent de respecter ces critères.

5.1 Assainissement non collectif

a) Généralités

En cas de zonage délibéré et approuvé par enquête publique, de la commune en assainissement non collectif, des aides peuvent être attribuées par les financeurs selon des critères. En effet, l'attribution des aides⁵ est soumise à des conditions telle que la réalisation d'opérations groupées de mise en conformité des dispositifs ANC, le cas des aides de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse.

Subventions de l'Agence de l'Eau – 12^e programme d'intervention 2025-2030

Les travaux de mise en conformité d'installations d'ANC existantes sont éligibles aux aides de l'Agence de l'Eau, dès lors que ces travaux sont nécessaires à l'atteinte du bon état des eaux ou répondent à un enjeu local de protection des ressources en eau.

Les opérations aidées doivent concerner un volume significatif d'installations à l'échelle de la commune concernée, et non un regroupement d'installations isolées. Sont éligibles :

- La mise en conformité des installations dans les communes inscrites dans un Plan d'Action Opérationnel Territorialisé (PAOT) ou prévues dans un Contrat de Territoires Eau et Climat (CTEC), sous réserve d'une notification de non-conformité par le SDANC 88 et avec un délai de réalisation de 4 ans et meilleur délai ;

Les opérations de réhabilitation des systèmes d'ANC sont conditionnées à :

- L'existence d'un avant-projet pour chaque dispositif d'assainissement non collectif avec la comparaison d'au moins 2 filières, dont 1 traditionnelle (si techniquement possible) ;
- L'avis favorable du SDANC 88 suite au contrôle de conception du dispositif projeté ;
- La signature de conventions justifiant de l'accord des particuliers sur l'opération de travaux et ses modalités de mise en œuvre.
- Le zonage délibéré et approuvé par enquête publique.

L'Agence de l'Eau privilégie les filières traditionnelles et rustiques avec diffusion de l'eau traitée dans le sol et les moins consommatrices d'énergie. (Source : A.E. Rhin-Meuse).

Le reste à charge pour le particulier dépend de l'ensemble des aides auxquelles il aurait droit. Par ailleurs, le coût annuel de fonctionnement des installations d'Assainissement Non Collectif est exclusivement à la charge du propriétaire.

⁵ Portail de l'assainissement non collectif : <https://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/aides-financieres-a813.html>

12^{ème} programme e l'agence de l'eau Rhin-Meuse : <https://www.eau-rhin-meuse.fr/12e-programme-dintervention-2025-2030#:~:text=Le%2012e%20programme%20d,'1%2C17%20Md%E2%82%AC>.

b) Aides à la mise en conformité de l'ANC

L'attribution des aides financières pour les travaux de mise en conformité des installations d'assainissement non collectif repose principalement sur le fait que l'opération ait un impact positif sur le milieu (inscription d'une action « assainissement » dans le Plan d'Action Opérationnel Territorialisé – PAOT).

Ces travaux sont considérés comme prioritaires pour la reconquête du bon état du milieu, notamment pour la masse d'eau « RUISSEAU DE NARBOIS » (rappel : état écologique (biologique) « **Médiocre** » et un état chimique « **Mauvais** », cf rapport de phase 1 – mai 2025) et peuvent prétendre à un soutien de l'Agence de l'Eau, sous couvert d'une **action GROUPEE**, d'une délibération approuvant le zonage ANC après enquête publique, de la réalisation d'étude préliminaire présentant la filière la plus adaptée à l'habitation et du conventionnement entre MOA public / Particuliers (voir conditions citées plus haut).

- Pour les communes inscrites au PAOT « TRAVAUX » ou « ETUDES » (le cas de CLEZENTAIN) et disposant d'installations déclarées non conformes par le SDANC 88, une aide forfaitaire de 4 000 € par installation peut être allouée ;

Les immeubles classés P1, P2, P5 et P6 par le SDANC88 pourraient prétendre à ces aides.

- Pour les communes ne relevant pas d'une action assainissement inscrite au PAOT, une aide peut être attribuée, sous couvert de l'existence d'un Contrat de Territoire Eau et Climat, CTEC, signé avec la Communauté de Communes et incluant des actions à 360° sur l'enjeu eau du territoire, dans lesquelles peuvent figurer des opérations groupées de réhabilitation d'ANC hors PAOT. Il faut préciser que la création d'un CTEC est en pourparlers entre la collectivité et l'Agence de l'Eau.

Dans ce cadre, une aide forfaitaire de 2 000 € par installation peut être octroyée pour les installations déclarées « Non Conformes » par le SDANC avec un délai de réhabilitation de 4 ans uniquement.

Les immeubles classés P1, P5 et P6 par le SDANC88 pourraient prétendre à ces aides.

Dans le cas de la commune de CLEZENTAIN, les aides potentielles de l'AERM seraient de 4 000 € par installation éligible.

De plus, nous avons pris comme hypothèse que les immeubles non visités sont classés non conformes et donc éligibles aux aides de l'AERM.

Tableau 20 : Potentielles aides de l'AERM pour la mise en conformité de l'ANC

Filières ANC	Nombre filières concernées	Subvention possible commune	Coût des travaux Scénario 1 (ANC)
Non conformes	82	328 000,00 €	1 145 200,00 €
Non visitées	10	40 000,00 €	

Le coût total de réhabilitation de l'ANC (scénario 1) à CLEZENTAIN est estimé à plus d'1,145 M € HT.

Une subvention potentielle de 368 000 € pourrait être accordée par l'Agence de l'Eau Rhin - Meuse (soit 4 000 € par immeuble pour 92 immeubles à inscrire dans une éventuelle opération groupée).

5.2 Assainissement collectif

a) Généralités

Le zonage d'assainissement collectif, s'il y a eu lieu, se traduit par l'engagement d'une collectivité à réaliser le projet d'assainissement collectif pour le raccordement des immeubles couverts par ce zonage durant une période (L'article 12 de l'arrêté du 21 juillet 2015 stipule que le diagnostic du système d'assainissement doit être réalisé au moins tous les dix ans, et que les zonages doivent être mis à jour si nécessaire en fonction des conclusions d'un diagnostic assainissement), qui sera financé par le Maître d'ouvrage (la commune dans le cas présent).

Subventions de l'Agence de l'Eau – 12^e programme d'intervention 2025-2030

Dans le cadre du 12^e programme de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse (2025-2030), plusieurs dispositifs d'aides financières sont prévus, sous conditions, pour les projets d'assainissement collectif dont :

◆ **Création d'un premier système d'assainissement collectif**

Afin d'éviter les coûts disproportionnés et d'encourager la recherche de solutions présentant le meilleur compromis technico-économique, les projets éligibles relatifs à la création d'un premier système d'assainissement collectif ne doivent **pas dépasser le coût unitaire de 15 000 € HT par branchement**.

◆ **Taux d'aide selon le type de projet**

- **60 % pour une commune inscrite au PAOT + 10 % pour les communes situées en zone France Ruralités Revitalisation (FRR) c'est le cas pour CLEZENTAIN.**
- **20 % pour les projets non-inscrits dans un PAOT, + 10 % pour les communes situées en zone France Ruralités Revitalisation (FRR).**

Des plafonds s'appliquent aux travaux pour le calcul de l'aide, fonction de la population (H = nombre d'habitants actuels en zone d'assainissement collectif).

A noter que ses plafonds ne s'appliquent pas pour les communes prioritaires, inscrites dans un PAOT, et ce jusqu'au 31/12/2027 :

<i>Population (H)</i>	<i>Plafond d'aide (€ HT)</i>
• 0 à 50 H :	7 700 € × H
• 51 à 100 H :	4 400 € × H + 161 150
• 101 à 200 H :	3 190 € × H + 279 400
• 201 à 1 000 H :	1 980 € × H + 519 750

◆ **Mise en conformité groupée des branchements privés**

Une aide peut également être apportée pour la mise en conformité des branchements privés. Cette opération doit être portée par une maîtrise d'ouvrage publique, et doit être groupée. L'Aide forfaitaire est de 2 500 € qui peut être complétée de 1 000 € si l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle est réalisée.

b) Aides pour la réalisation d'un système d'assainissement collectif

Pour la commune de CLEZENTAIN, le coût estimé pour la mise en place d'un assainissement collectif (hors travaux sur domaine privé) s'élève à environ **17 000 € HT / branchement**.

Ce montant dépassant le coût d'exclusion fixée par l'AERM (limitation des aides pour des projets dont le coût de branchement est supérieur à 15 000 € HT / branchement), la commune de CLEZENTAIN ne pourrait pas prétendre à aucune aide financière de la part de l'agence de l'eau. De plus, en comparant les 2 solutions techniques, il s'avère que l'ANC présente le meilleur compromis technico-économico-environnemental.

Les subventions de l'AERM étant susceptibles d'évoluer dans le temps (en fonction de la disponibilité des enveloppes et de l'évolution des politiques budgétaires), il a été décidé en accord avec le comité de pilotage de modérer ces modalités d'aides, permettant de réaliser plusieurs simulations financières afin de permettre à la commune concernée d'avoir une vision sur les montants des investissements à réaliser.

Sur la commune de CLEZENTAIN (inscrite dans un PAOT) les simulations financières suivantes ont été réalisées :

-  **Simulation 1 avec un taux d'aides à 0 % ;**
-  **Simulation 2 avec un taux d'aides à 70 % (60% PAOT + 10% FRR)**

c) Dépenses liées à l'assainissement collectif

Afin de pouvoir financer le projet, le Maître d'Ouvrage pourra éventuellement contracter un **prêt bancaire. Pour la suite de ce rapport et en accord avec l'Assistant à Maître d'Ouvrage, nous avons pris comme hypothèse un prêt d'une durée de 30 ans avec un taux de 3,2%.**

Les dépenses annuelles pour la commune de CLEZENTAIN seront les suivantes :

- **Annuité** relative au prêt bancaire pour l'investissement ;
- **Coût annuel d'exploitation**, soit les dépenses d'entretien et d'exploitation du système.

d) Recettes liées à l'assainissement collectif

La mise en œuvre d'un système d'assainissement collectif génère des recettes, financées par les usagers et dites « redevance assainissement ».

Pour rappel, la commune n'est pas desservie par un système d'assainissement collectif. Les redevances actuelles de l'assainissement sont relatives aux dépenses liées à l'ANC.

Les recettes liées à l'assainissement collectif peuvent varier suivant le règlement de service mis en place à cet effet :

1. Mise en place d'une tarification adaptée pour l'autofinancement du projet (avec un impact significatif sur le prix de l'assainissement) ;
2. Mise en place d'une tarification cohérente avec les tarifications moyennes appliquées, (nécessite un apport initial pour l'investissement par exemple) ;

Dans le cadre de cette étude, nous avons retenu le volume annuel potentiellement facturable en nous basant sur les données de consommation d'eau potable analysées lors de la phase 1, couvrant les années 2021 à 2024.

Tableau 21 : Nombre d'abonnés à l'assainissement collectif et volume potentiellement facturable

Nombre abonnés	102	Abonnés
Volume moyen annuel facturable	9 855	m ³ /an

Le volume moyen annuel facturable a été établi sur la base de la consommation des 270 équivalents-habitants (EH) raccordés au système collectif avec une dotation hydrique de 100 litres/jour/habitant (cf rapport phase 1 – page 22).

6. Simulation financière 1 - Subvention à 0%

a) Coût global annuel à la charge du porteur de projet

Par hypothèse dans cette simulation, CLEZENTAIN n'est pas éligible aux subventions de l'AERM.

Le tableau ci-dessous présente le coût global à la charge du porteur du projet durant 30 ans de remboursement du prêt bancaire, et qui sera réduit ensuite pour couvrir les charges d'exploitation du système d'assainissement collectif.

Note : le prix de l'assainissement pourrait être fixé, à l'issue du remboursement du prêt bancaire pour l'investissement, en fonction des charges d'exploitation **ainsi que pour couvrir l'amortissement du système**, c'est-à-dire l'atteinte d'un budget qui permettrait les premières réhabilitations du système d'assainissement collectif après 40 ans à 60 ans d'exploitation.

Tableau 22 : Coût annuel de l'assainissement collectif – simulation à 0% d'aides

Commune de CLEZENTAIN		
Simulation financière 1 (en € HT)		
Nombre de raccordement		102 abonnés
Nombre d'habitants en zone collective		270 habitants
Coûts de collecte et transfert		1 056 350,00 €
Coût de la STEU		521 500,00 €
MOE et imprévus (10%)		157 785,00 €
TOTAL investissement		1 735 635,00 €
Subventions (AERM)	0,00%	- €
Reste à charge du MOA		1 735 635,00 €
Frais financiers	Prêt	1 735 600,00 €
	Durée (ans)	30
	Taux d'intérêt	3,20%
	Annuité	90 853,52 €
	Remboursement du capital	57 853,33 €
	Remboursement de l'intérêt	33 000,19 €
Exploitation		
Coût total d'exploitation / an		15 720,00 €
COÛT ANNUEL (H.T.)		106 573,52 €

Le projet, d'un coût total de 1,735 M € HT sera financé par le MOA au vu de l'absence de subventions. Le coût annuel global à la charge du maître d'ouvrage durant 30 ans, incluant l'exploitation, s'élève à plus de 106 000,00€ HT/an.

b) Financement par la commune

La grille tarifaire suivante a été définie de manière à permettre le financement du projet d'assainissement collectif tout en assurant la couverture des frais d'exploitation du système. Les tarifs proposés sont exclusivement calculés pour couvrir deux postes de dépenses :

- Le remboursement de l'annuité du prêt bancaire contracté pour les travaux ;
- Les charges d'exploitation annuelles du service.

La simulation financière présentée intègre ainsi l'ensemble des coûts annuels prévisionnels liés à l'assainissement collectif de la commune de CLEZENTAIN et applique le tarif envisagé. L'objectif est d'assurer l'équilibre financier du projet en autonomie, par le biais des redevances perçues auprès des usagers.

La redevance proposée pour les usagers de CLEZENTAIN est la suivante :

Tableau 23 : Redevance d'assainissement proposée pour l'assainissement collectif

Redevance assainissement		
Part variable (H.T.)	<u>Voir le graphique suivant</u>	€/m ³
Part fixe annuelle	40	€/an

La tarification variable en €/m³ pour cette simulation est présentée comme suit :

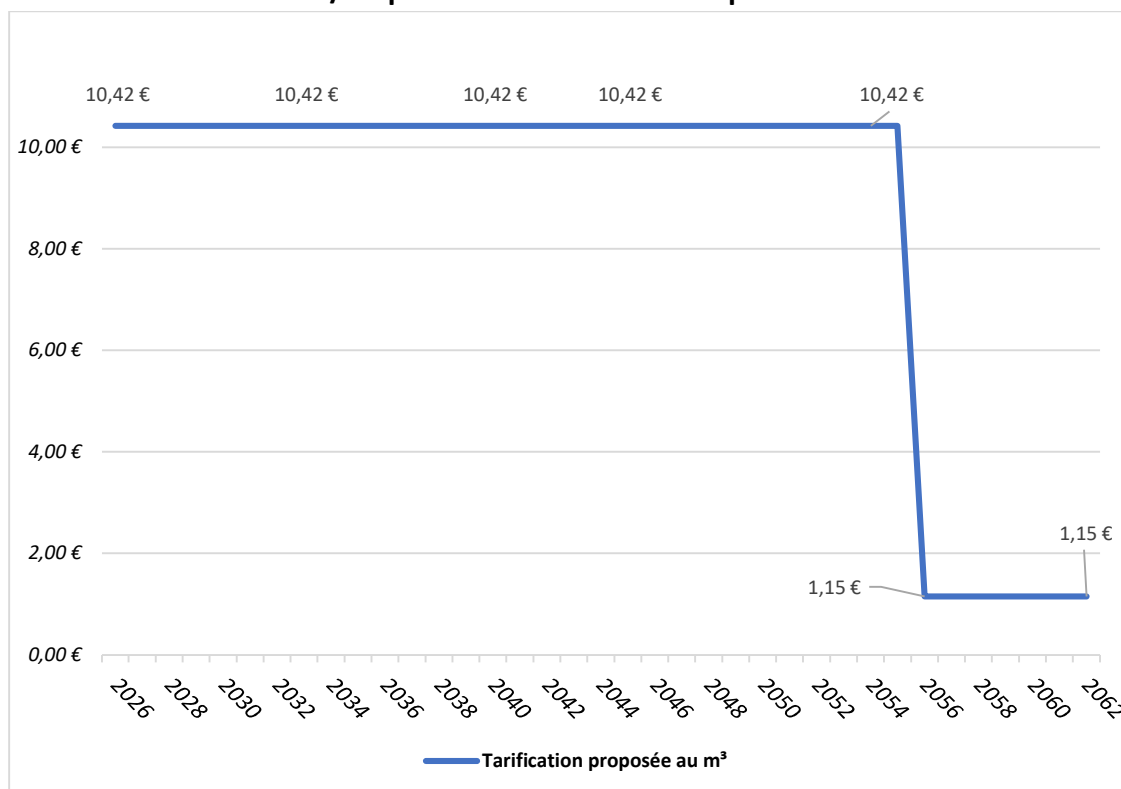


Figure 8 : Proposition du prix de l'assainissement (€/m³) – simulation à 0% d'aides

Le tarif proposé (10,42 €/m³ en moyenne sur les 30 premières années), permettra le remboursement du prêt et la couverture des frais d'exploitation du réseau et de la STEU. A l'issue des 30 ans, le prix de l'eau sera revu à la baisse (1,15 €/m³), afin de pouvoir couvrir uniquement les dépenses liées à l'exploitation des ouvrages.

Les courbes du graphique suivant illustrent les bilans recettes/dépenses via le plan de financement proposé : 40 € (part fixe) pour la redevance présentée précédemment et une tarification (variation de prix du mètre-cube d'eau) adaptée pour couvrir seulement les charges annuelles pour le porteur du projet :

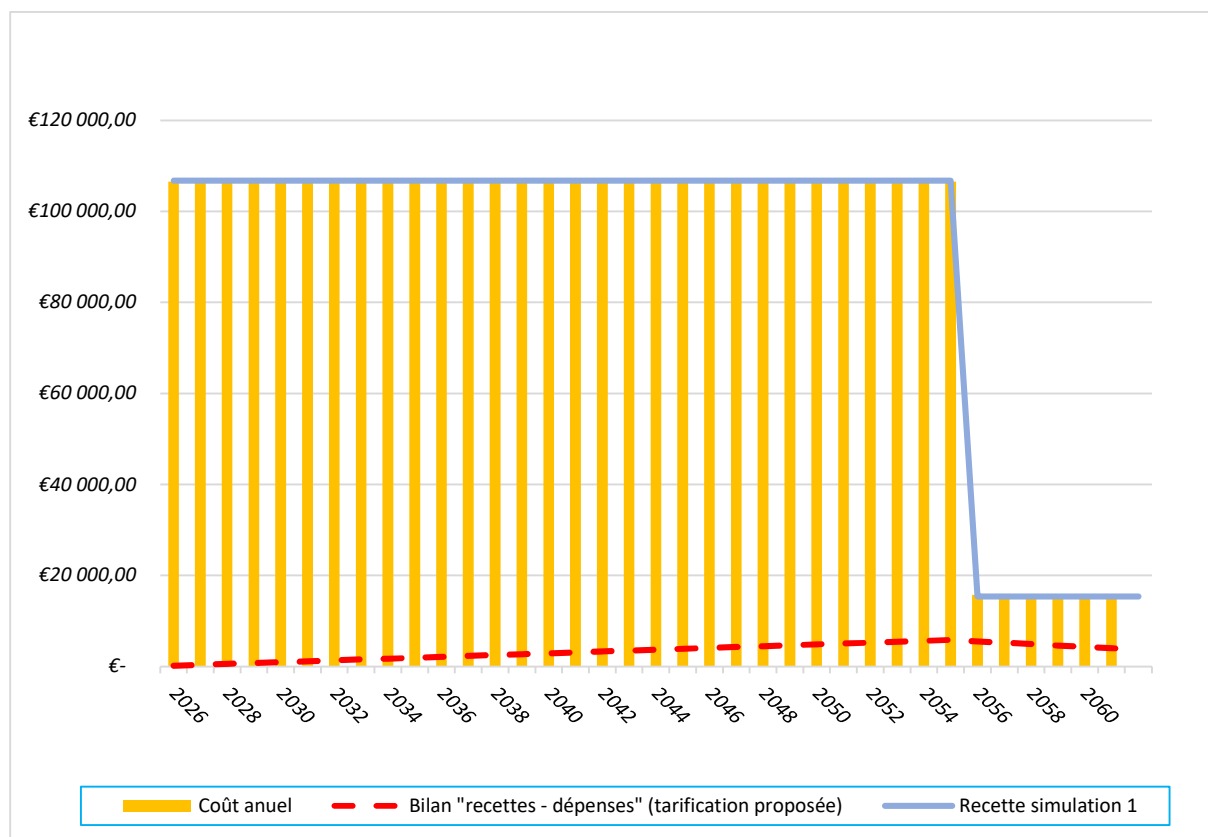


Figure 9 : Simulation financière 1 – simulation à 0% d'aides

En conclusion, pour financer les dépenses annuelles, la tarification de l'assainissement devrait être fixée à :

- Part fixe = 40 H.T. €/an
- Part variable = 10,42 € H.T. /m³ en moyenne durant les 30 années de remboursement du prêt. Ce tarif pourrait être revu à la baisse jusqu'à 1,15 € H.T./m³, correspondant à la redevance nécessaire pour couvrir uniquement les coûts d'exploitation du système d'assainissement collectif

Pour une consommation d'eau moyenne de 120 m³/an/abonné (pour un foyer moyen au titre de la classification de l'INSEE), la facture annuelle serait de 1 290 € H.T./ an / abonné, et serait de 178 € H.T./ an / abonné après 30 ans de remboursement du prêt bancaire.

Pour rappel, l'impact sur le prix de l'eau sera déterminé par la commune de CLEZENTAIN puisqu'elle détient la compétence « assainissement collectif ».

7. Simulation financière 2 - Subvention à 70%

a) Coût global annuel à la charge du porteur de projet

Il faut rappeler que cette **simulation financière n'est donnée qu'à titre indicatif** puisque le coût moyen du branchement de 17 000 € HT dépasse le coût d'exclusion fixée par l'AERM à 15 000 € HT (cf chapitre 5.2 assainissement collectif).

Néanmoins dans cette hypothèse, la commune de CLEZENTAIN est éligible à des aides de 70% de la part de l'agence de l'eau.

Le tableau ci-dessous présente le coût global résultant de l'annuité relative à l'investissement initial pour le projet d'assainissement collectif ainsi que le coût d'exploitation du système.

Tableau 24 : Coût annuel de l'assainissement collectif – simulation à 70% d'aides

Commune de CLEZENTAIN		
Simulation financière 2 (en € HT)		
Nombre de raccordement		102 abonnés
Nombre d'habitants en zone collective		270 habitants
Coûts de collecte et transfert		1 056 350,00 €
Coût de la STEU		521 500,00 €
MOE et imprévus (10%)		157 785,00 €
TOTAL investissement		1 735 635,00 €
Subventions (AERM)	70 %	1 214 944,50 €
Reste à charge du MOA		520 690,50 €
Frais financiers	Prêt	520 600,00 €
	Durée (ans)	30
	Taux d'intérêt	3,20%
	Annuité	27 251,87 €
	Remboursement du capital	17 353,33 €
	Remboursement de l'intérêt	9 898,53 €
Exploitation		
Coût total d'exploitation / an		15 720,00 €
COÛT ANNUEL (H.T.)		42 971,87 €

Dans cette simulation, subventionnée à 70%, le montant restant à la charge du maître d'ouvrage n'est plus que de 520 600 € qui sera couvert par un emprunt.

Le coût annuel global, incluant l'exploitation, s'élèverait à 42 970 € HT/an environ.

b) Financement par la commune

La grille tarifaire suivante a été définie de manière à permettre le financement du projet d'assainissement collectif tout en assurant la couverture des frais d'exploitation du système.

Les tarifs proposés sont exclusivement calculés pour couvrir deux postes de dépenses :

- Le remboursement de l'annuité du prêt bancaire contracté pour les travaux ;
- Les charges d'exploitation annuelles du service.

La simulation financière présentée intègre ainsi l'ensemble des coûts annuels prévisionnels liés à l'assainissement collectif de la commune de CLEZENTAIN, et applique le tarif envisagé. L'objectif est d'assurer l'équilibre financier du projet en autonomie, par le biais des redevances perçues auprès des usagers.

La redevance proposée pour les usagers de CLEZENTAIN est la suivante :

Tableau 25 : Redevance d'assainissement proposée pour l'assainissement collectif

Redevance assainissement		
Part variable (H.T.)	<u>Voir le graphique suivant</u>	€/m ³
Part fixe annuelle	40	€/an

La tarification « variable / m³ » pour cette simulation est présentée dans le graphique suivant :

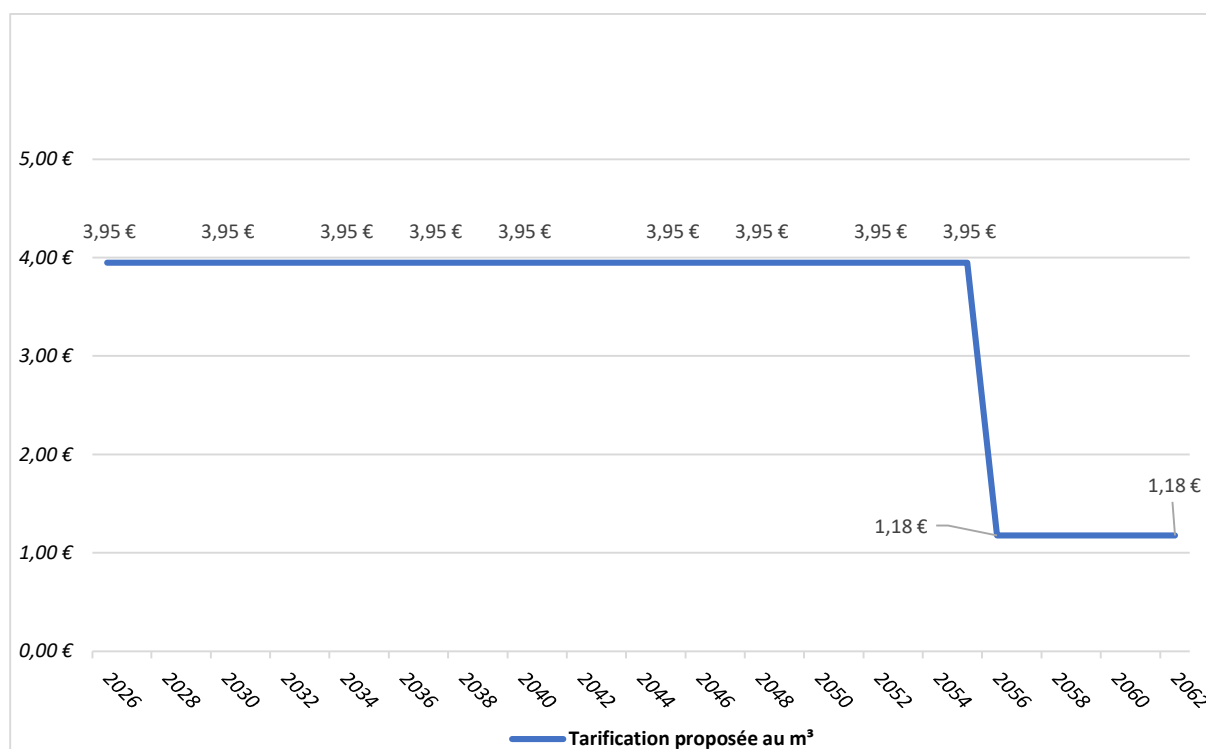


Figure 10 : Proposition du prix de l'assainissement en €/m³ – simulation à 70% d'aides

Le tarif proposé (3,95 €/m³ en moyenne sur les 30 premières années), permettra le remboursement du prêt bancaire et la couverture des frais d'exploitation du réseau et de la STEU. A l'issue des 30 ans, le prix de l'eau sera revu à la baisse (1,18 €/m³), afin de pouvoir couvrir uniquement les dépenses d'exploitation des ouvrages.

Les courbes du graphique suivant illustrent les bilans recettes/dépenses via le plan de financement proposé, soit la redevance présentée précédemment, soit une tarification adaptée pour couvrir seulement les charges annuelles pour les porteurs du projet :

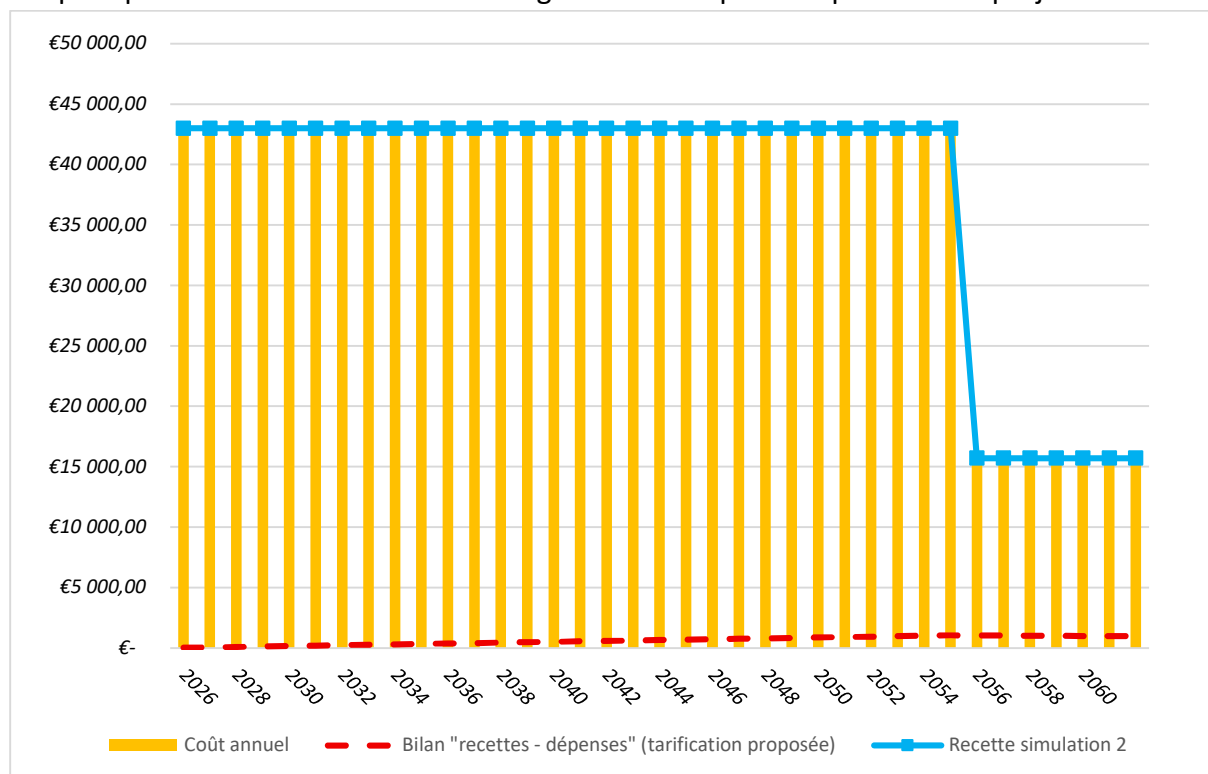


Figure 11 : Simulation financière 2 - simulation à 70% d'aides

Pour financer les dépenses annuelles, la tarification de l'assainissement devrait être fixée à :

- **Part fixe = 40 H.T. €/an**
- **Part variable = Le tarif de 3,95 € H.T./m³ en moyenne sur les 30 années de remboursement du prêt. Ce tarif pourrait être revu à la baisse jusqu'à 1,18 € H.T./m³, correspondant à la redevance nécessaire pour couvrir uniquement les coûts d'exploitation du système d'assainissement collectif**

Pour une consommation d'eau moyenne de 120 m³/an/abonné (pour un foyer moyen au titre de la classification de l'INSEE), la facture annuelle serait de 514 € H.T./ an/ abonné, et serait de 181 € H.T./ an/ abonné après 30 ans de remboursement du prêt bancaire.

Pour rappel, l'impact sur le prix de l'eau sera déterminé par la commune de CLEZENTAIN puisque'elle détient la compétence « assainissement collectif ».

POURSUITE DE L'ETUDE ET ORIENTATIONS DE LA PHASE 3

Conformément aux dispositions de l'article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'élaboration des zonages d'assainissement, cette étude a permis d'analyser les spécificités de la commune de CLEZENTAIN afin d'identifier les solutions de mise en conformité de l'assainissement.

L'analyse technico-économique des deux scénarios envisagés – scénario 1 : assainissement non collectif (ANC) et scénario 2 : assainissement collectif – a offert une vision claire des coûts d'investissement et de fonctionnement, facilitant ainsi la prise de décision.

La commune de CLEZENTAIN dispose désormais des éléments nécessaires pour choisir la solution la plus pertinente en tenant compte des enjeux techniques, environnementaux et financiers.

Il est à noter qu'aucun amortissement n'a été intégré dans cette analyse. La durée de vie d'une station de traitement des eaux usées (STEU) étant estimée à 40 ans et celle des réseaux à 60 ans, l'ajout d'un amortissement pourrait être envisagé, notamment à la demande des financeurs tels que l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse. Cette approche permettrait d'anticiper le financement d'éventuels travaux de réhabilitation à l'issue de la période d'amortissement, bien qu'elle impliquerait une charge annuelle supplémentaire à intégrer dans le modèle économique actuel du projet.

Afin d'affiner l'aide à la décision, une étude complémentaire pourrait être menée en amont de tous travaux à projeter, à savoir une étude de maîtrise d'œuvre complète pour approfondir l'évaluation des impacts financiers et identifier les leviers de financement optimaux pour garantir la pérennité des infrastructures d'assainissement.

Les estimations financières précédentes plaident nettement en faveur du scénario 1, avec un coût de mise en œuvre d'un assainissement conforme près de deux fois inférieur à la solution d'assainissement collective.

Toutefois, il faudra prendre en considération le facteur humain. En effet, des travaux de réhabilitation de l'assainissement non collectif, intervenant donc sur le domaine privé avec des contraintes importantes, ainsi que la mise en œuvre de dispositifs à la technicité relativement élevée engendrant des frais de fonctionnement non négligeables, peuvent être mal perçus par la population concernée.

En revanche, la différence des coûts de fonctionnement entre ces 2 solutions est également fortement prononcée, mais largement à l'avantage du scénario n°2.

Le scénario d'assainissement retenu par la commune de CLEZENTAIN servira de base pour élaborer le zonage d'assainissement communal qui devra être proposé aux habitants par l'intermédiaire d'une enquête publique.

En résumé, le zonage d'assainissement permet de protéger la santé publique et l'environnement, d'organiser la gestion de l'assainissement (investissement, extension, rénovation de l'assainissements collectif ou individuel), de connaître si une parcelle ou un bâtiment relève de l'assainissement collectif ou de l'ANC.

ANNEXES

ANNEXE 1

SYNTHESE DE L'ASSAINISSEMENT EXISTANT ET PROJECTION DU SCENARIO 1




ETUDE DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT
COMMUNE DE CLEZENTAIN
- Carte de synthèse de l'assainissement existant
et projection Scénario 1 -
Août 2025

Légende

Assainissement existant
Réseau pluvial
Branchement
Fossé


Classification bâti
(contrôles SDANC au 31/01/2025)
Non visité
P1 : Installation non conforme - Travaux obligatoires sous 4 ans, 1 an si vente (dans l'année, par l'acquéreur)
P2 : Installation non conforme - Uniquement si vente (dans l'année, par l'acquéreur)
P3 : Installation conforme - Recommandations d'amélioration du système
P4 : Installation conforme
Pas de travaux
P5 : Installation non conforme - Travaux dans les meilleurs délais (manque d'information sur le système)
P6 : Installation non conforme
Travaux dans les plus brefs délais
CC : Contrôle de conception
Dépôt dossier réhabilitation auprès du SDANC
Bâti agricole

N°	Filière	CSD
1	F.T.	50
2	F.T.	0
3	F.C.	20
4	F.C.	0
5	F.C.	20
6	F.C.	20
7	F.C.	20
8	F.C.	20
9	F.C.	20
10	F.C.	20
11	F.T.	20
12	F.C.	20
13	M.S.	30
14	F.C.	20
15	F.C.	20
16	F.C.	20
17	M.S.	20
18	M.S.	20
19	M.S.	20
20	F.C.	20
21	M.S.	20
22	M.S.	20
23	M.S.	20
24	M.S.	20
25	M.S.	40
26	M.S.	40
27	M.S.	0
28	M.S.	20
29	M.S.	50
30	M.S.	20
31	F.C.	20
32	F.C.	0
33	M.S.	40
34	M.S.	20
35	M.S.	20
36	F.C.	170
37	M.S.	20
38	M.S.	20
39	M.S.	20
40	F.C.	20
41	F.C.	20
42	M.S.	20
43	M.S.	20
44	F.C.	20
45	F.C.	20
46	F.C.	20
47	M.S.	20
48	F.C.	20
49	F.C.	20
50	F.C.	40
51	M.S.	20
52	M.S.	0
53	F.C.	20
54	F.C.	20
55	F.T.	0
56	M.S.	20
57	F.T.	20
58	F.C.	20
59	F.C.	20
60	F.C.	40
61	F.T.	20
62	F.C.	20
63	F.C.	0
64	F.T.	30
65	F.C.	20
66	M.S.	20
67	M.S.	20
68	M.S.	20
69	M.S.	20
70	M.S.	40
71	F.C.	50
72	M.S.	20
73	M.S.	20
74	M.S.	20
75	M.S.	20
76	M.S.	20
77	M.S.	0
78	F.C.	0
79	M.S.	20
80	M.S.	20
81	M.S.	20
82	F.C.	0
83	F.T.	0
84	F.C.	20
85	F.T.	0
86	F.T.	20
87	M.S.	30
88	M.S.	40
89	M.S.	20
90	M.S.	20
91	F.C.	0
92	M.S.	0
93	M.S.	20
94	F.C.	20
95	M.S.	40
96	M.S.	50
97	M.S.	20
98	F.T.	20
99	F.T.	20
100	M.S.	40
101	F.C.	0
102	F.T.	0
103	M.S.	20
104	F.C.	20
105	M.S.	20
106	M.S.	20
107	M.S.	0
108	F.T.	20

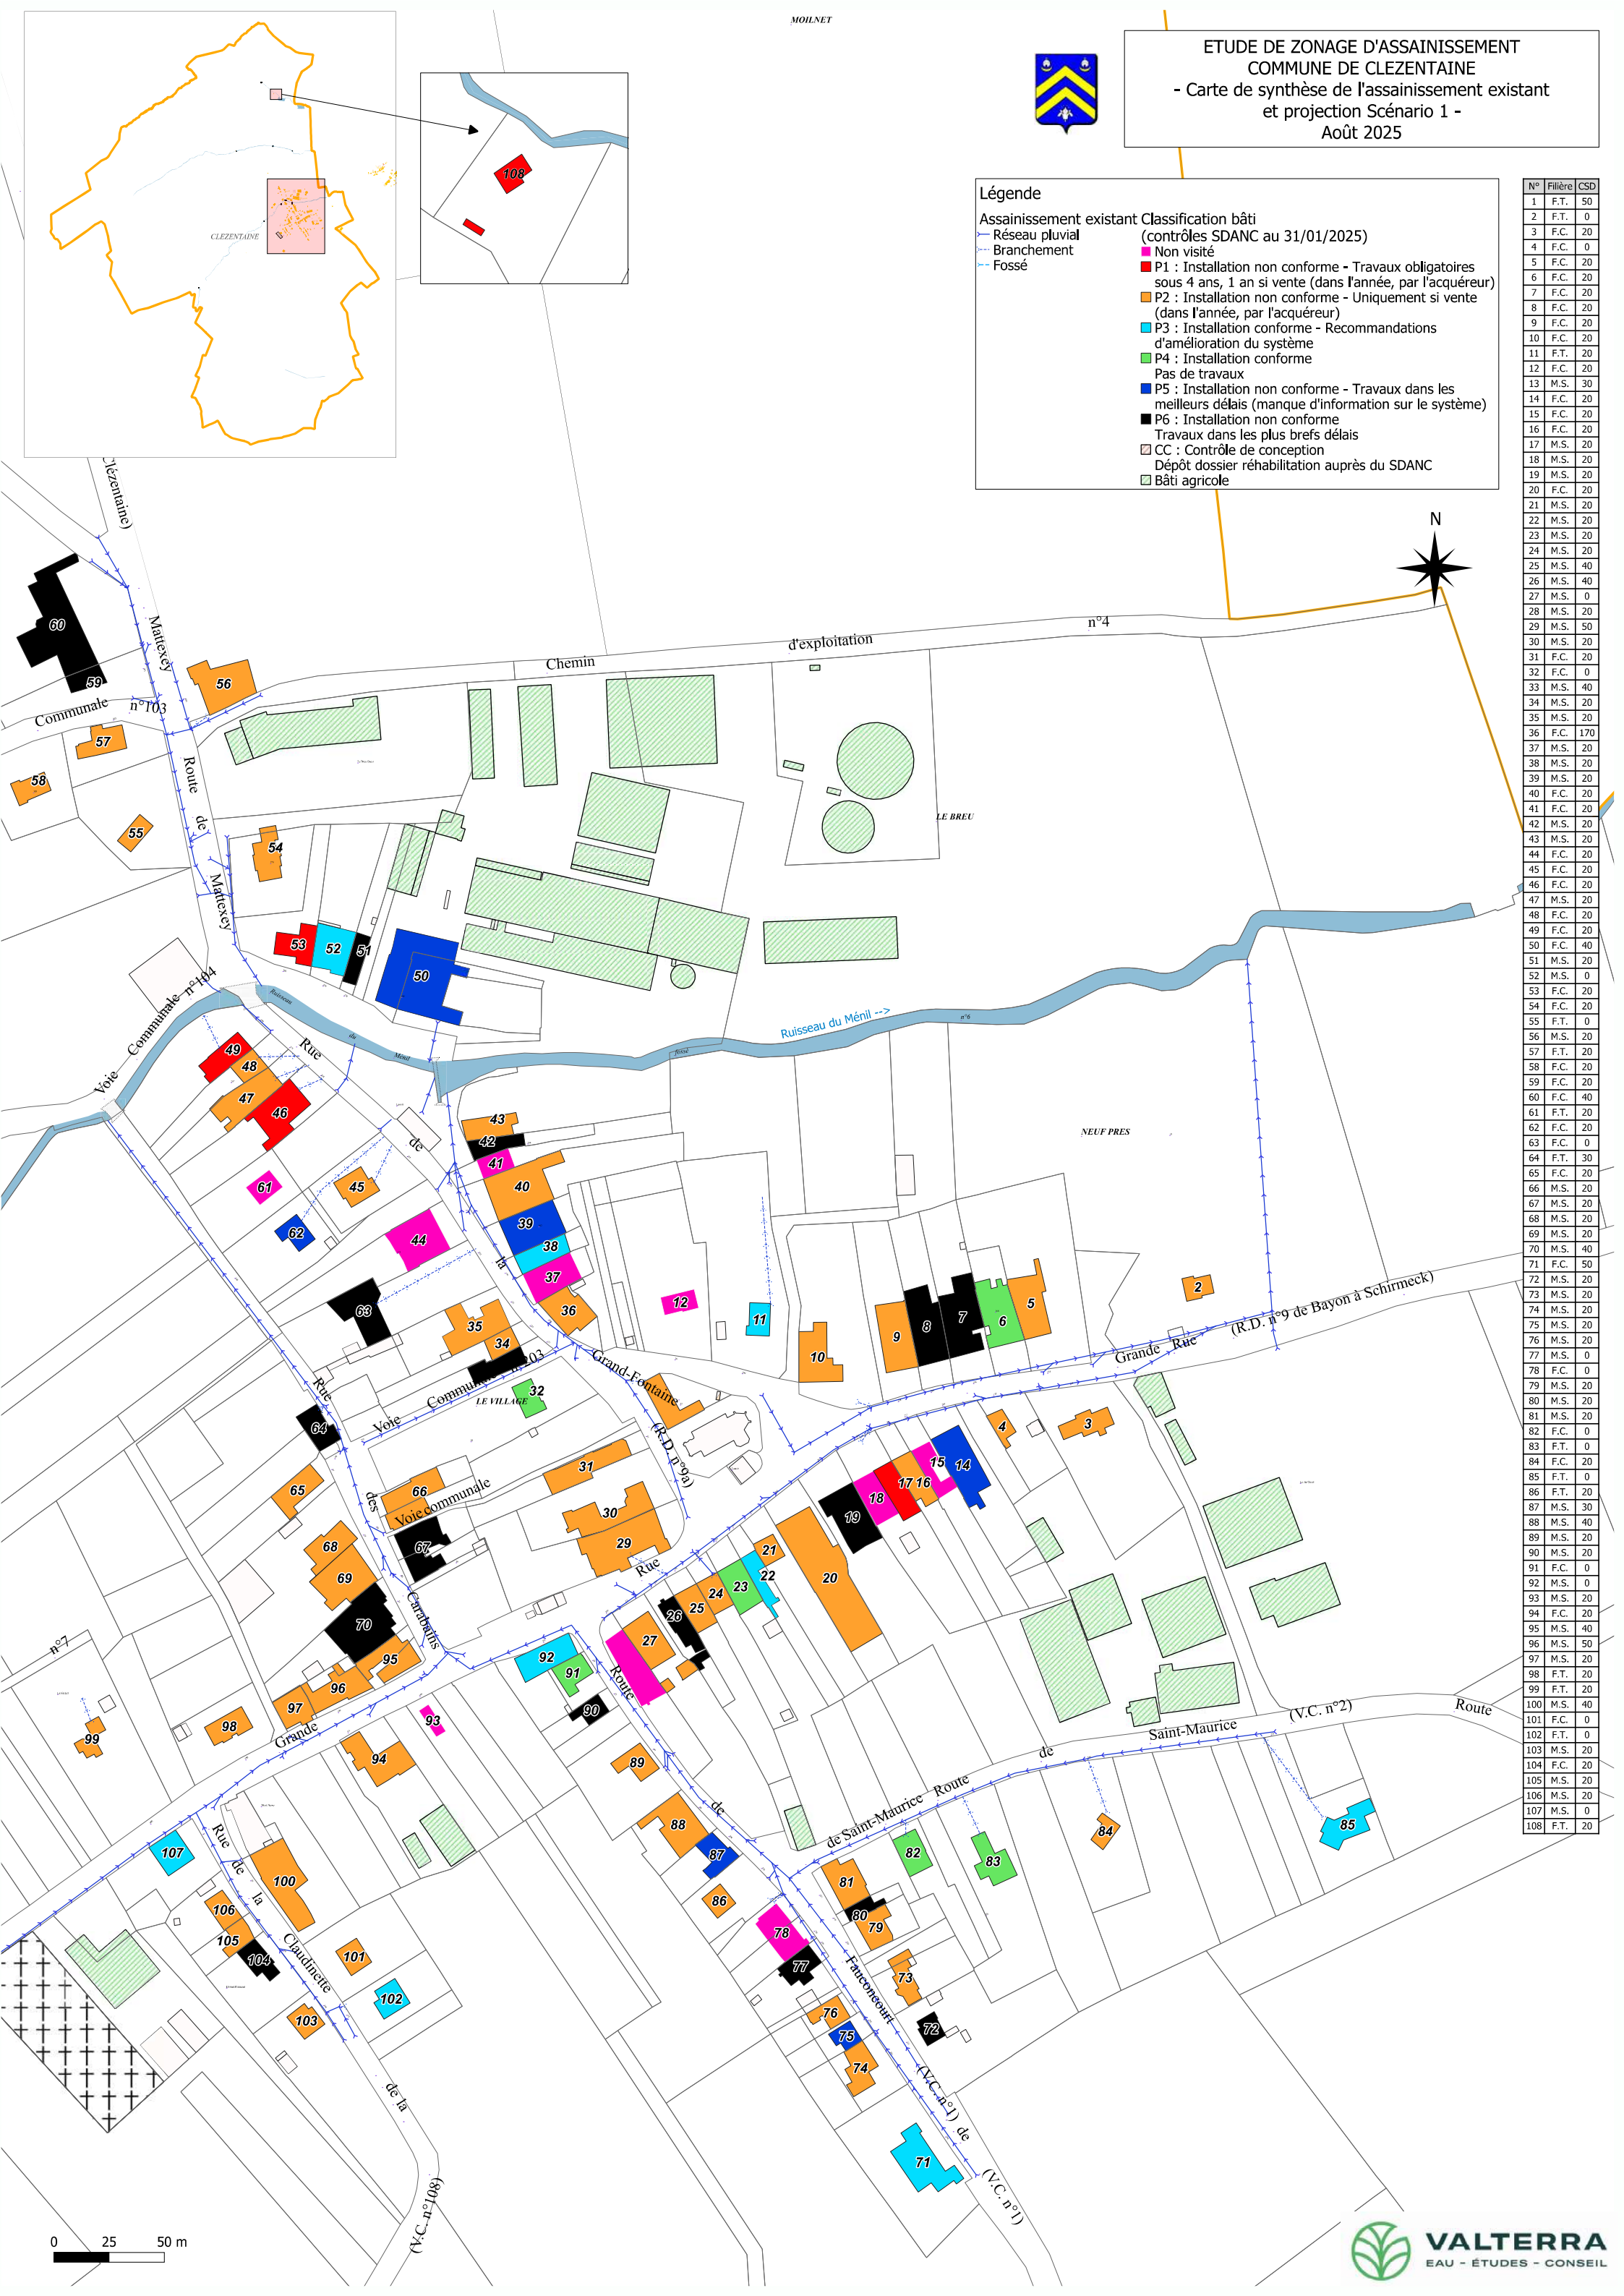

ANNEXE 2

PLAN DU SCENARIO D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF



MOINET



- Légende
- Immeuble non raccordé (ANC)
 - Immeuble raccordé
 - Projet assainissement
 - PR Poste de refolement projeté
 - Canalisation de refolement projetée
 - Réseau des eaux usées projeté
 - Canalisation projetée en surprofondeur
 - Traversée ruisseau (fonçage)
 - Site de traitement - proposition Mairie
